

下水道管理センター雨水ポンプ増設工事(電気) 工事状況

令和3年12月末 進捗率 約75%

12月は、下水道管理センターポンプ棟において、コントロールセンター盤、補助継電器盤及びケーブル設置等のためのピット工事(コンクリート床はつり)を行いました。
1月は、引き続き、ピット工事を行い、各種電気盤の架台設置を行います。




ピット工事(コンクリート床はつり)状況




ピット工事(コンクリート床はつり)状況



ピット工事(コンクリート床はつり)状況

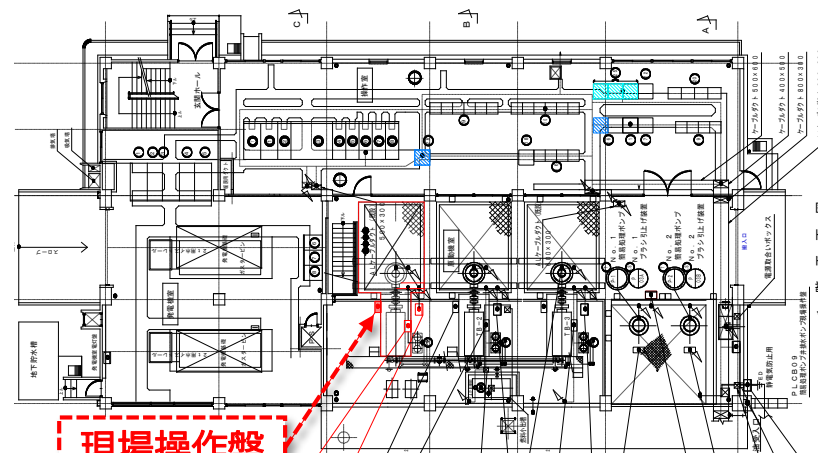

平面図(ポンプ棟1階)

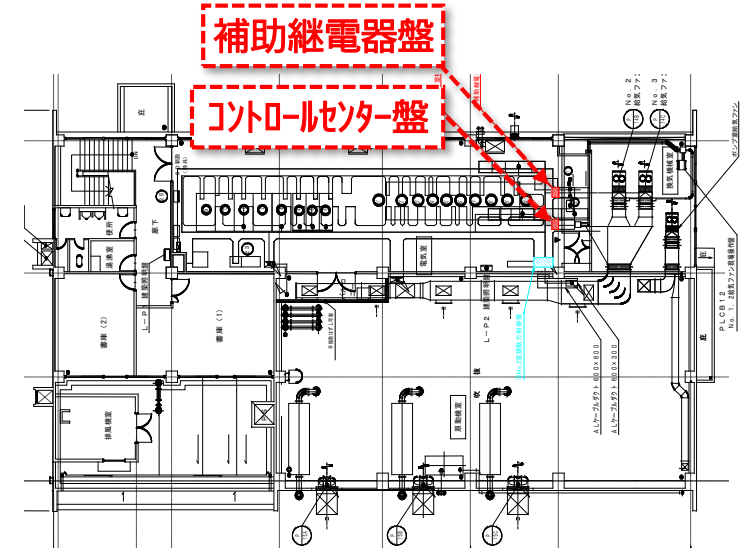

平面図(ポンプ棟2階)
