133号雨水幹線公共下水道築造工事第8工区 工事状況

令和4年1月末 進捗率 約91%


1月は、ボックスカルバートの埋戻し及び仮設土留、覆工板撤去を行い、No.3特殊人孔築造等を行いました。 2月は、引き続き、No.3特殊人孔築造を行い、道路構造物(街渠桝、歩車道境界ブロック等)の復旧等を行います。



埋戻し・転圧、覆工板受桁撤去状況



埋戻し・転圧、舗装仮復旧状況

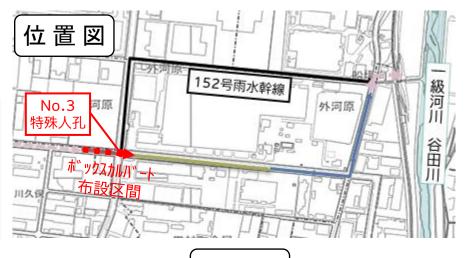



No.3特殊人孔築造(床版据付)状況



ボックスカルバート布設完了(内部)状況(R3.12月時点)

