

石塚貯留管築造工事 工事状況

令和4年3月末 進捗率 約18%

3月は、推進工事に係る発進立坑の仮設土留(鋼矢板)設置及び掘削、基礎工を行い、到達立坑の仮設土留設置に着手しました。


4月は、引き続き、到達立坑の仮設土留設置を行い、推進用ヒューム管施工に係る坑口処理等に着手します。



仮設土留設置状況



掘削・支保状況

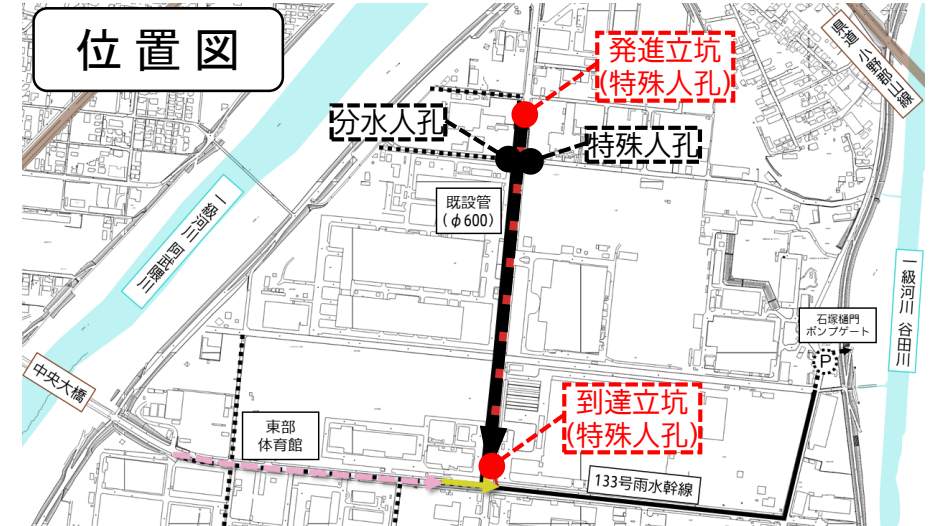

交通規制図 (発進立坑)



基礎コンクリート打設完了状況



仮設土留設置(先行掘削)状況

