

133号雨水幹線公共下水道築造工事第9工区 工事状況

令和5年1月末 進捗率 約27%


1月は、仮設土留工（親杭（H鋼）、横矢板設置）、覆工板設置を行いました。
2月は、ボックスカルバートの設置などを行います。



親杭横矢板設置状況



桁受設置状況

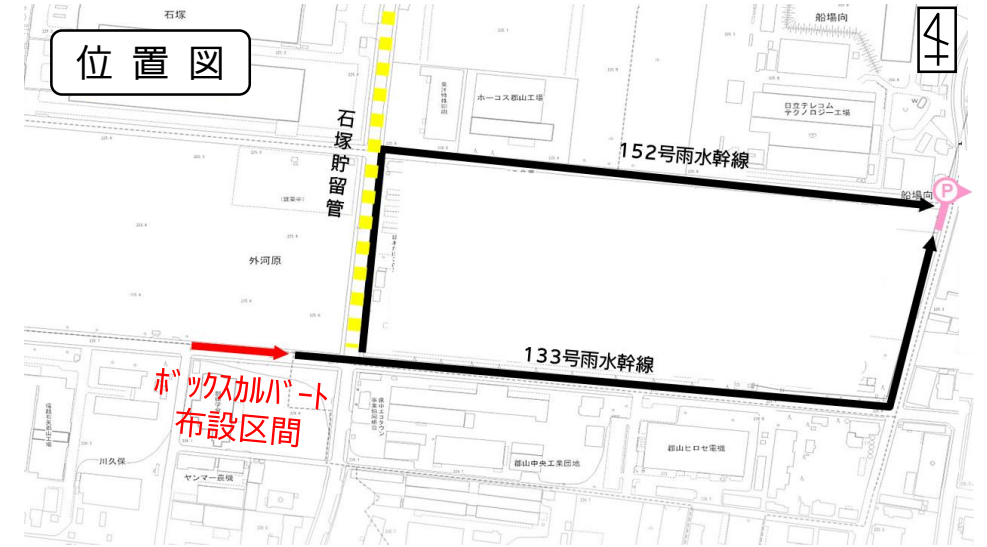

覆工板設置状況



覆工板設置完了

