

# 133号雨水幹線公共下水道築造工事第10工区 工事状況

令和5年12月末 進捗率 約37%


12月は、特殊人孔部の掘削、床付及び基礎コンクリート打設を行いました。  
 1月は、特殊人孔築造及びボックスカルバート部の掘削・切梁・腹起しを行います。



掘削状況



特殊人孔床付完了

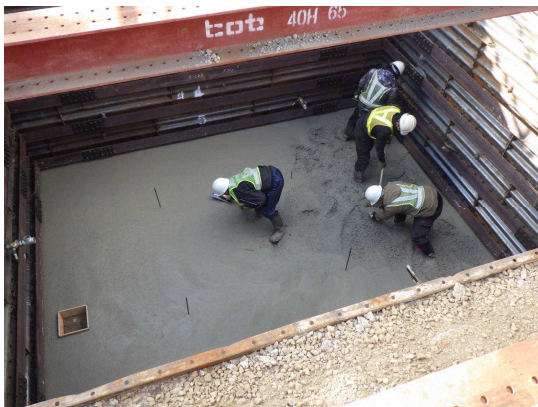

特殊人孔基礎コンクリート打設状況



特殊人孔基礎コンクリート打設完了

