


# 133号雨水幹線公共下水道築造工事 第10工区 工事状況

令和6年3月末 進捗率 約59%

3月は、ボックスカルバート部の掘削、切梁・腹起し、基礎工及び布設を行いました。  
 4月は、ボックスカルバート布設、埋戻し、親杭（H鋼）引抜き及び特殊人孔築造を行います。

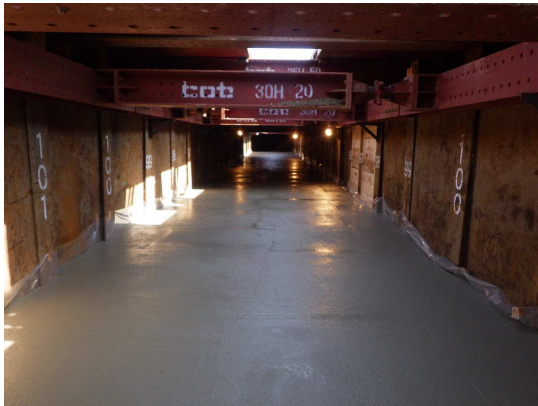

基礎コンクリート打設完了



ボックスカルバート搬入状況



ボックスカルバート布設状況



ボックスカルバート布設完了

