

180号雨水幹線公共下水道築造工事 第1工区 工事状況

令和6年11月末 進捗率 約20%

11月は、既設舗装版撤去、布掘り及び鋼矢板圧入などを行いました。
12月は、地盤改良のための薬液注入及び掘削などを行います。




既設舗装版撤去完了



鋼矢板圧入箇所布掘り状況



鋼矢板圧入状況

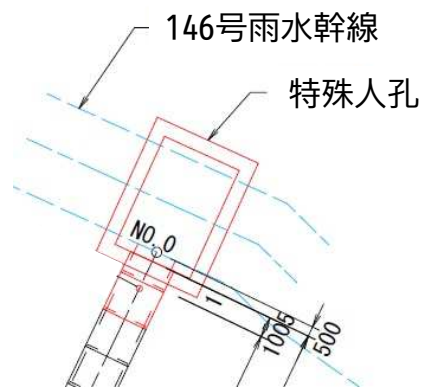

平面図

