


3号幹線放流管築造工事 第5工区 工事状況

令和6年11月末 進捗率 約14%

11月は、覆工板設置、掘削、土留工及びボックスカルバート布設を行いました。
12月は、掘削、土留工及びボックスカルバート布設を行う予定です。

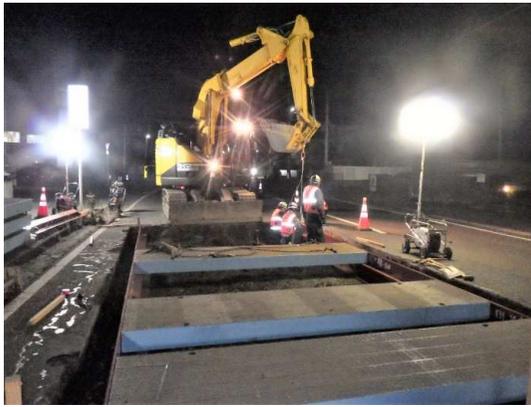


覆工板設置状況



建込簡易土留設置状況



ボックスカルバート布設完了

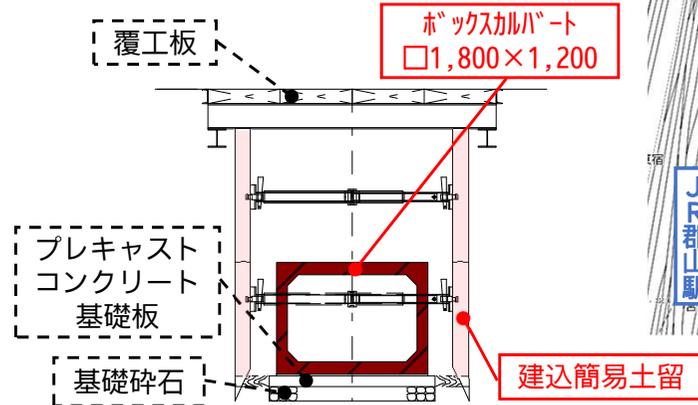

断面図

