

(令和6年度) 大町土地区画整理事業 ペDESTロリアンデッキ整備工事(施設下部工) 工事状況
 施行場所：郡山市駅前二丁目 地内（都市計画道路 日の出通り線）

令和6(2024)年10月末 進捗率 約23%

10月は、都市計画道路日の出通り線北側におけるペDESTロリアンデッキの基礎杭(小口径回転杭工 $\phi 400\text{mm}$ 、 $L=26.0\text{m}$ 、 $N=12$ 本(4本/箇所))設置が完了し、仮設土留め(鋼矢板)設置を行いました。
 11月は、フーチング基礎工($N=4$ 箇所)の施工に着手します。



仮設土留め(鋼矢板圧入)施工状況(北西側を望む)




仮設土留め(鋼矢板圧入)施工状況(南西側を望む)



仮設土留め(鋼矢板圧入)施工状況(北東側を望む)



仮設土留め(鋼矢板圧入)施工状況(全景)

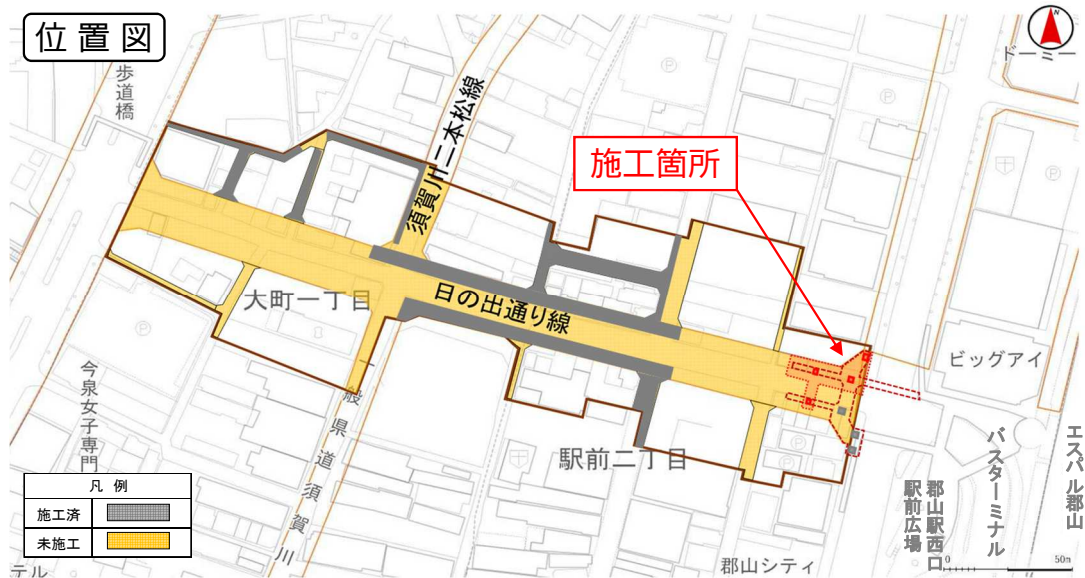

凡 例	
施工済	
未施工	

平面図

基礎構造図

小口径回転杭工 $\phi 400\text{mm}$ $L=26.0\text{m}$ $N=12$ 本(4本/箇所)

