

119号雨水幹線公共下水道築造工事第1工区 工事状況

令和元年12月末 進捗率 約87%

12月は、立坑No.2～3までの推進工法によるL1-M管布設を行い、掘進機が既設雨水幹線まで到達しました。1月は、既設雨水幹線到達箇所への接合処理を行い、掘進機設備等の撤去に着手します。



既設雨水幹線
(内部)No.3

到達箇所の17削孔完了状況



既設雨水幹線
(内部)No.3

到達箇所の取壊し状況




既設雨水幹線
(内部)No.3

掘進機到達状況



立坑No.2

推進工法(L1-M管布設)完了状況

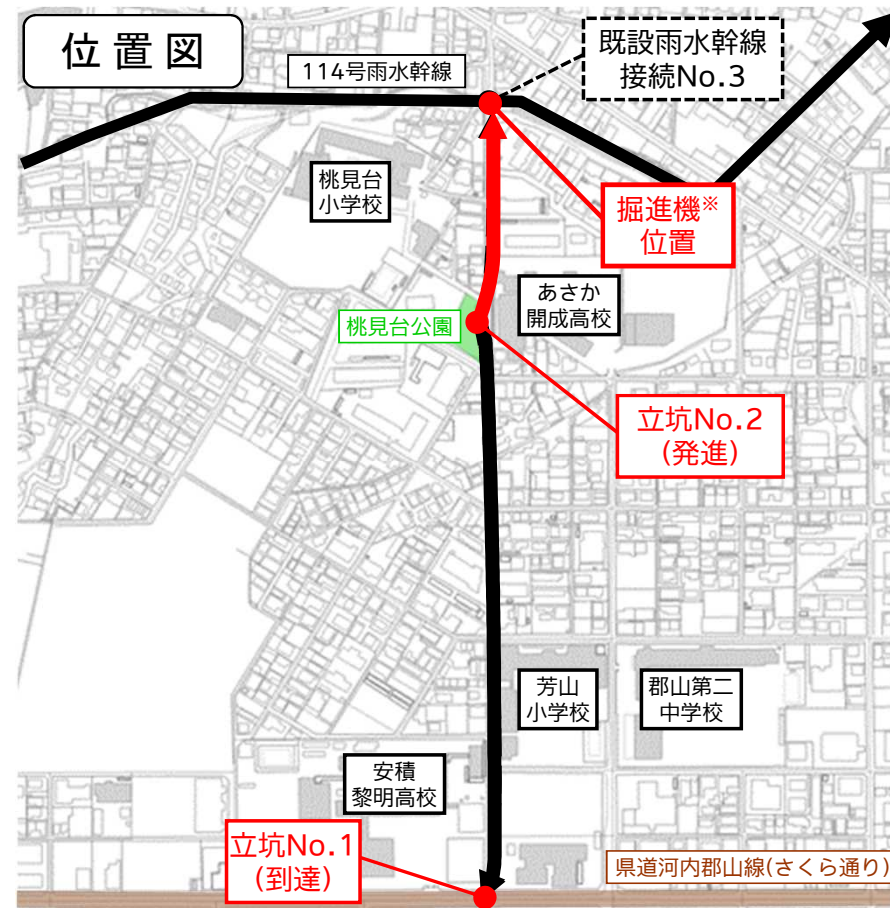

掘進機※…地中を掘り進むための機械。
