

# 公共下水道整備事業 富田東地区

4

進捗(11月末現在)

約13%(948.2m / 7070m)

## 測量設計期間

1工区：R7.2月～R7.6月

2工区：R7.3月～R7.9月

3工区：R7.5月～R7.12月

富田東  
小学校

富田  
中学校


2工区

3工区


1工区

## 凡 例

整備済  
2024～2026年度整備区域  
整備済  
施工予定  
事業計画区域





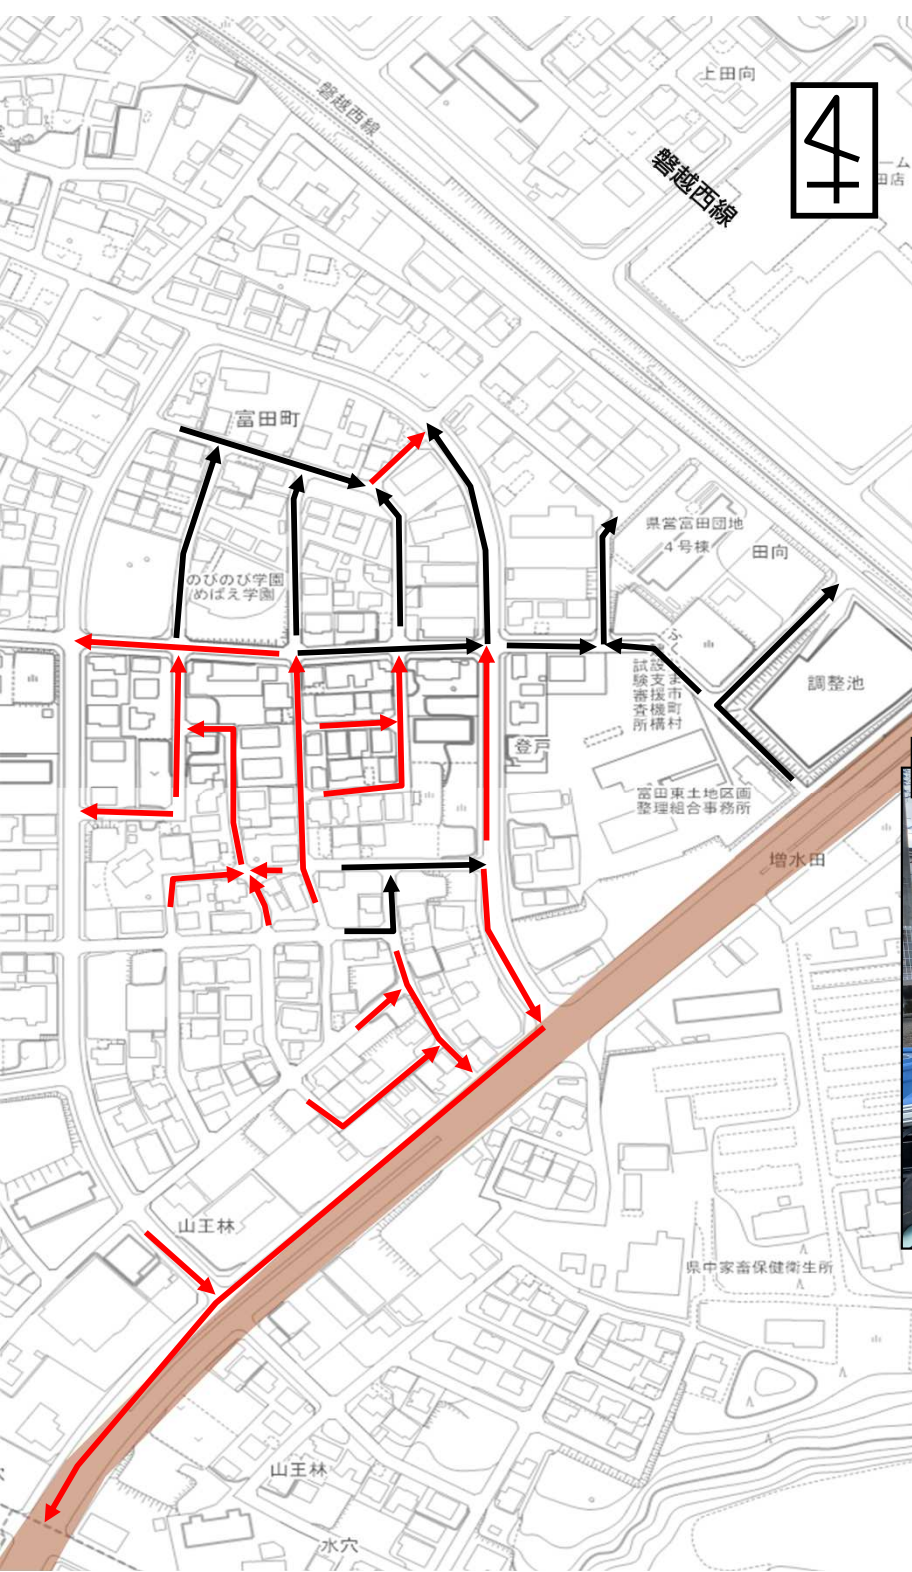

## 1 工区進捗 (11月末現在)

→ 下水道管

施工済み →

管路布設状況

948.2 m / 2,356m

マンホール設置状況

38箇所 / 81箇所

掘削状況



管路布設状況



現在、下水管の布設工事が本格的に始まり、「道路の掘削」「下水道管の布設」「埋戻し」「舗装の仮復旧」の流れで施工しております。工事中は車の出入り等、皆様にご不便をおかけしますが、安全第一で進めてまいりますので、ご協力をお願いいたします。
