

公共下水道整備事業 富田東地区

4

進捗(1月末現在)

約25%(1732m / 7070m)

測量設計期間

1工区：R7.2月～R7.6月

2工区：R7.3月～R8.3月

3工区：R7.5月～R8.3月

富田東
小学校

富田
中学校

2工区

3工区

1工区

郡山インター線

5-1号污水幹線

凡 例


整備済

整備済

施工予定

事業計画区域



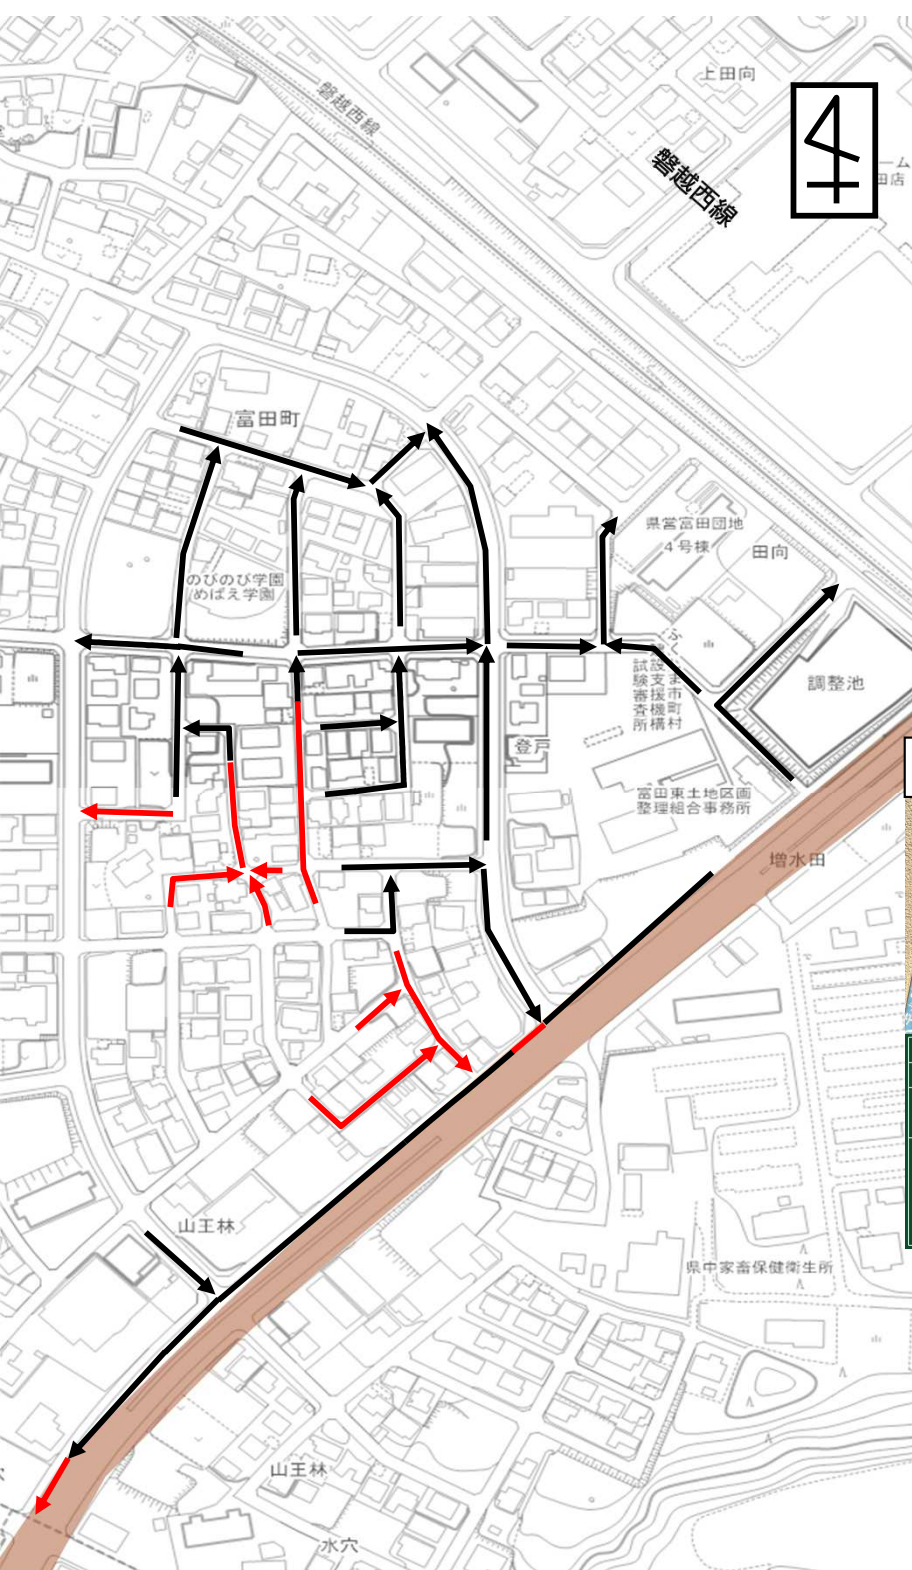

1工区進捗（1月末現在）

→ 下水道管

施工済み →

管路布設状況

1732m / 2372m

マンホール設置状況

56箇所 / 80箇所

マンホール設置完了



塩ビマンホール設置完了



現在、下水管の布設工事が本格的に始まり、「道路の掘削」「下水道管の布設」「埋戻し」「舗装の仮復旧」の流れで施工しております。工事中は車の出入り等、皆様にご不便をおかけしますが、安全第一で進めてまいりますので、ご協力をお願いいたします。
