

# 公共下水道整備事業 富田東地区

4

進捗(3月末現在)

約34%(2372m / 7070m)

## 測量設計期間

- 1工区 : R7.2月~R7.6月
- 2工区 : R7.3月~R8.3月
- 3工区 : R7.5月~R8.3月

富田東  
小学校

富田  
中学校



3工区


1工区

2工区

## 凡 例

- 整備済
- 2024~2026年度整備区域
- 整備済
- 施工予定
- 事業計画区域

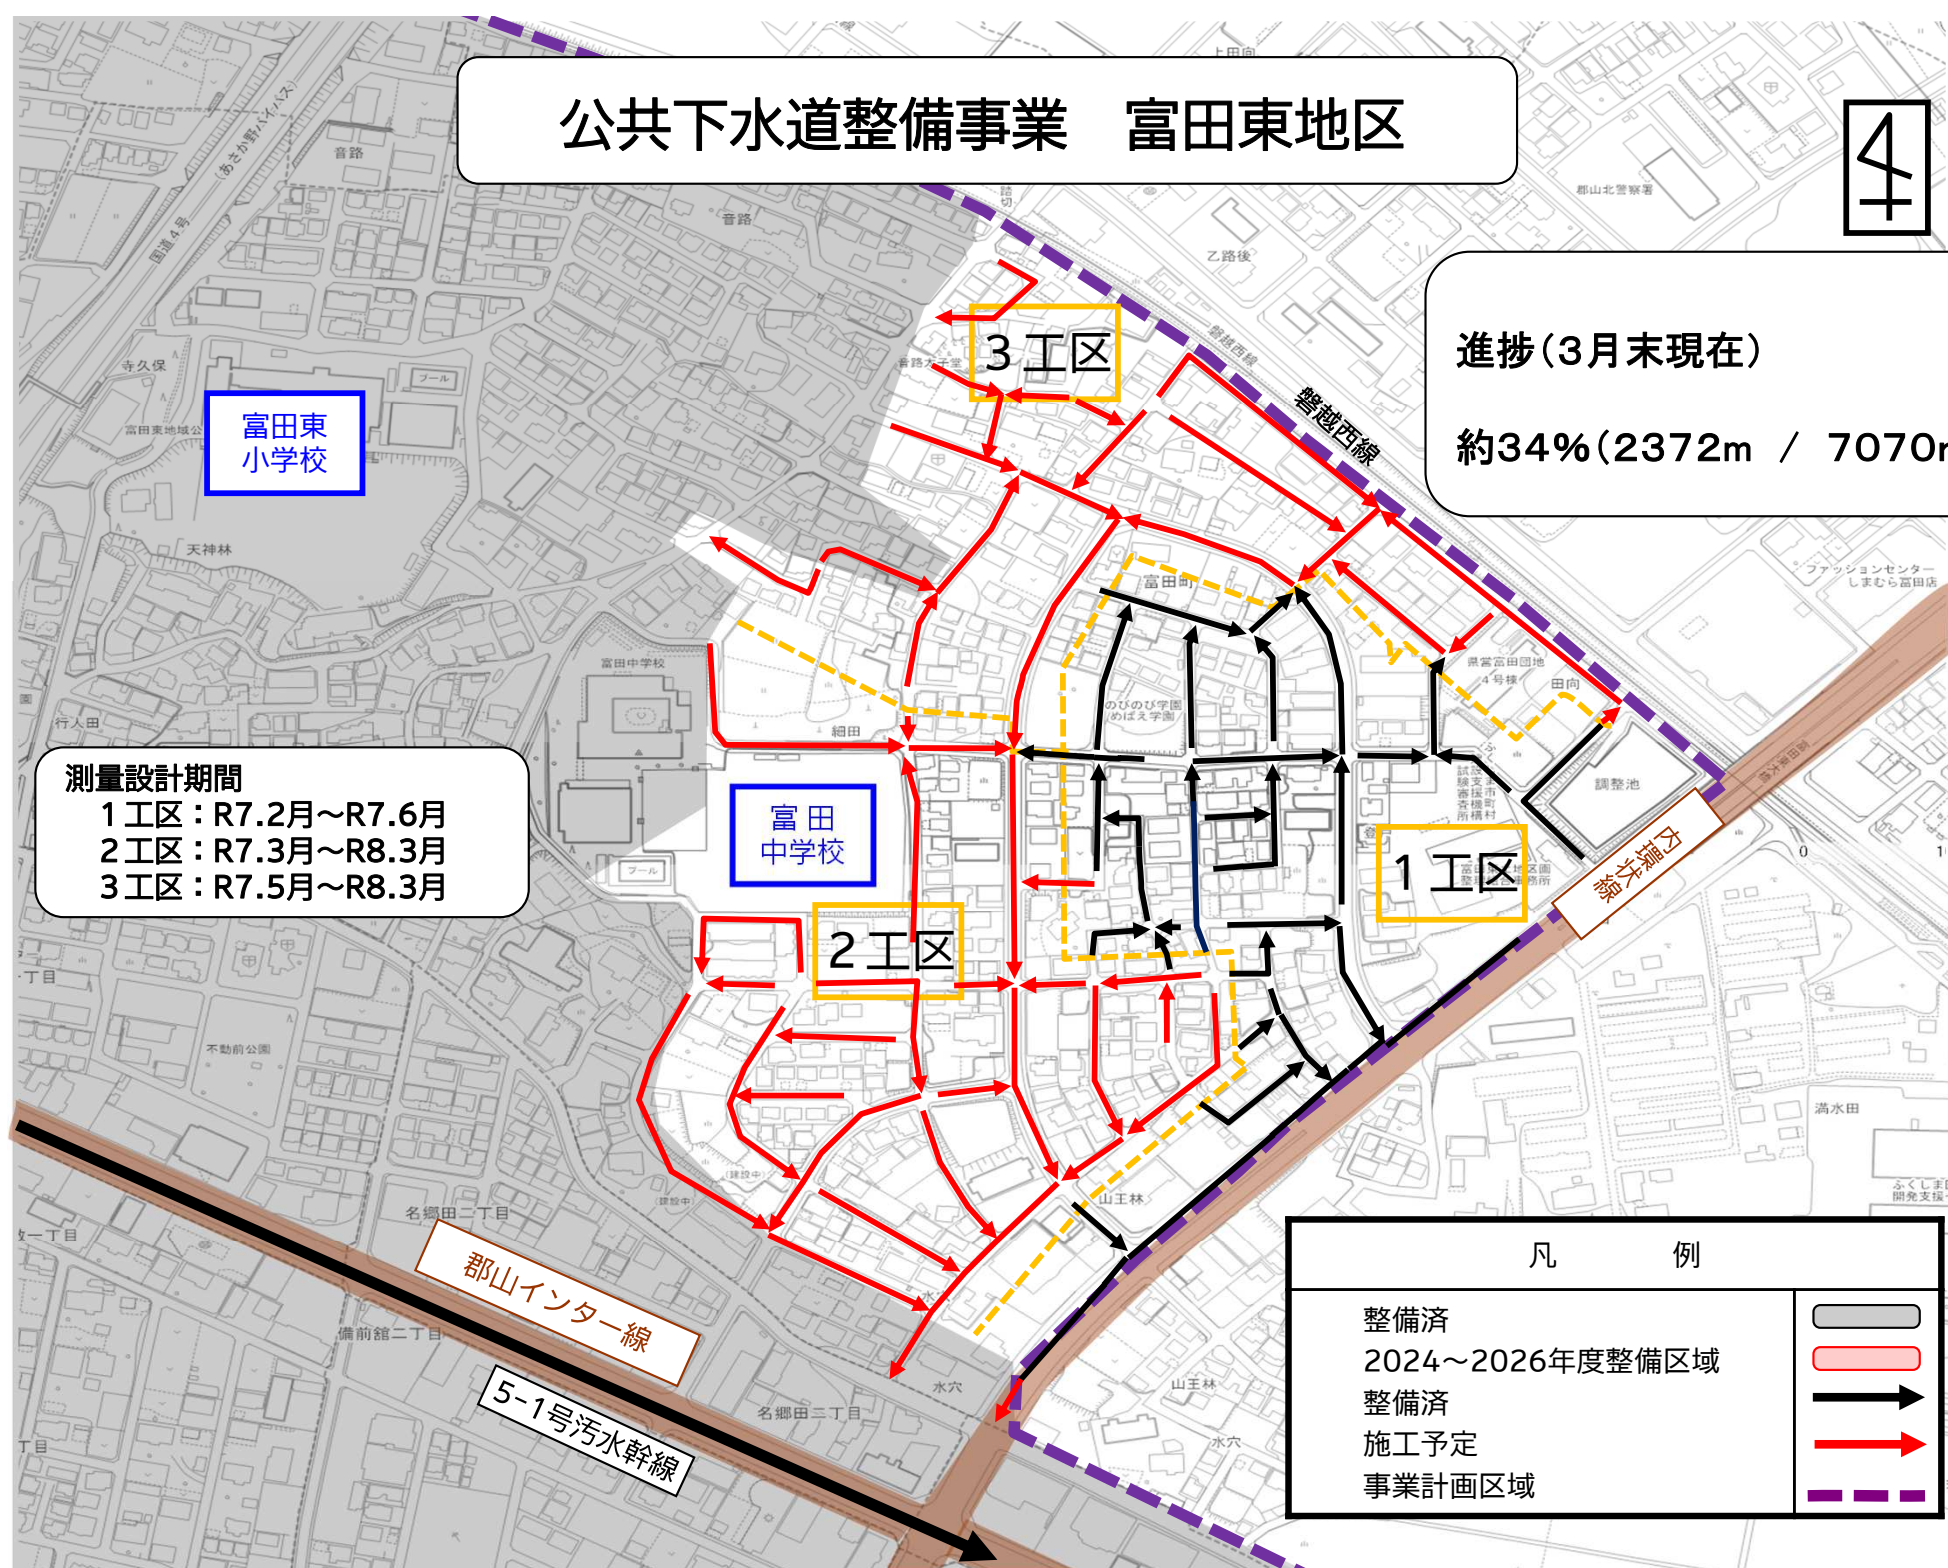

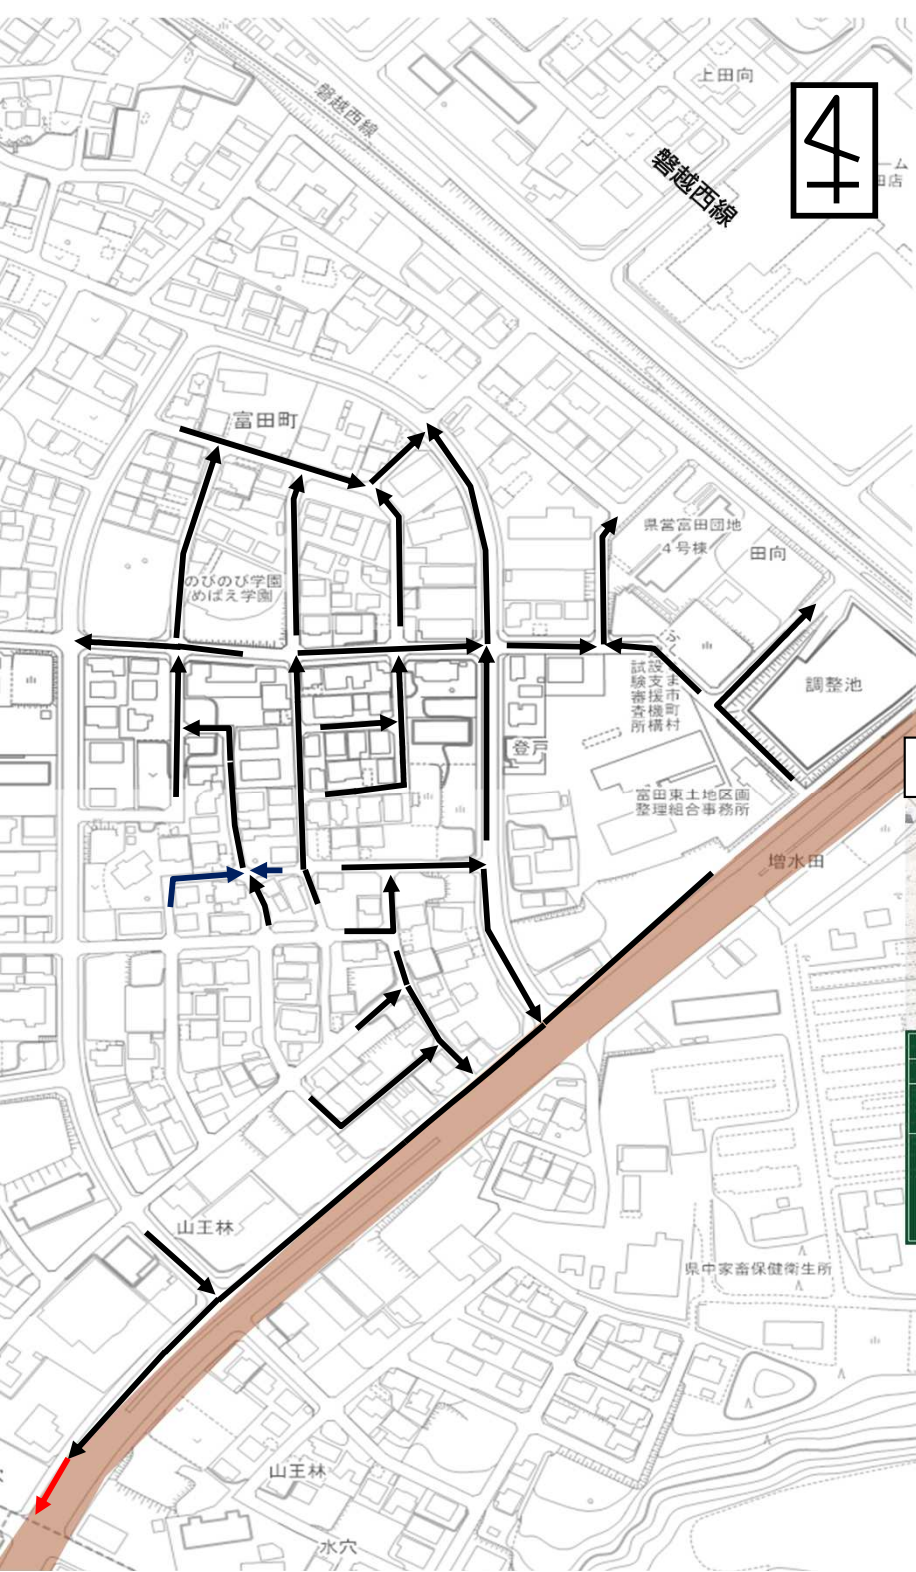

# 1 工区進捗（3月末現在）

→ 下水道本管

施工済み →

|           |               |
|-----------|---------------|
| 管路布設状況    | 2372m / 2372m |
| マンホール設置状況 | 80箇所 / 80箇所   |

汚水柵設置状況



|    |             |
|----|-------------|
| 工種 | 取付管及び汚水柵設置工 |
| 位置 | No. 村田様宅    |
| 状況 | 汚水柵設置状況     |

汚水柵設置完了



|    |             |
|----|-------------|
| 工種 | 取付管及び汚水柵設置工 |
| 位置 | No. 村田様宅    |
| 状況 | 立上り管設置完了    |

着手から約6ヶ月が過ぎ、皆様のご協力もいただき、工事は順調に進んでおります。下水道本管の施工は100%完了となりました。残工事は汚水柵の設置と舗装復旧となります。  
事故等がないようにさらに安全対策に留意してまいりますのでご協力の程よろしくお願いたします。
