

公共下水道整備事業 富田東地区

4

進捗(4月末現在)

約34%(2372m / 7070m)

測量設計期間

- 1工区 : R7.2月~R7.6月
- 2工区 : R7.3月~R8.5月
- 3工区 : R7.5月~R8.8月

富田東
小学校

富田
中学校



3工区


1工区

2工区

凡 例

- 整備済
- 2024~2026年度整備区域
- 整備済
- 施工予定
- 事業計画区域

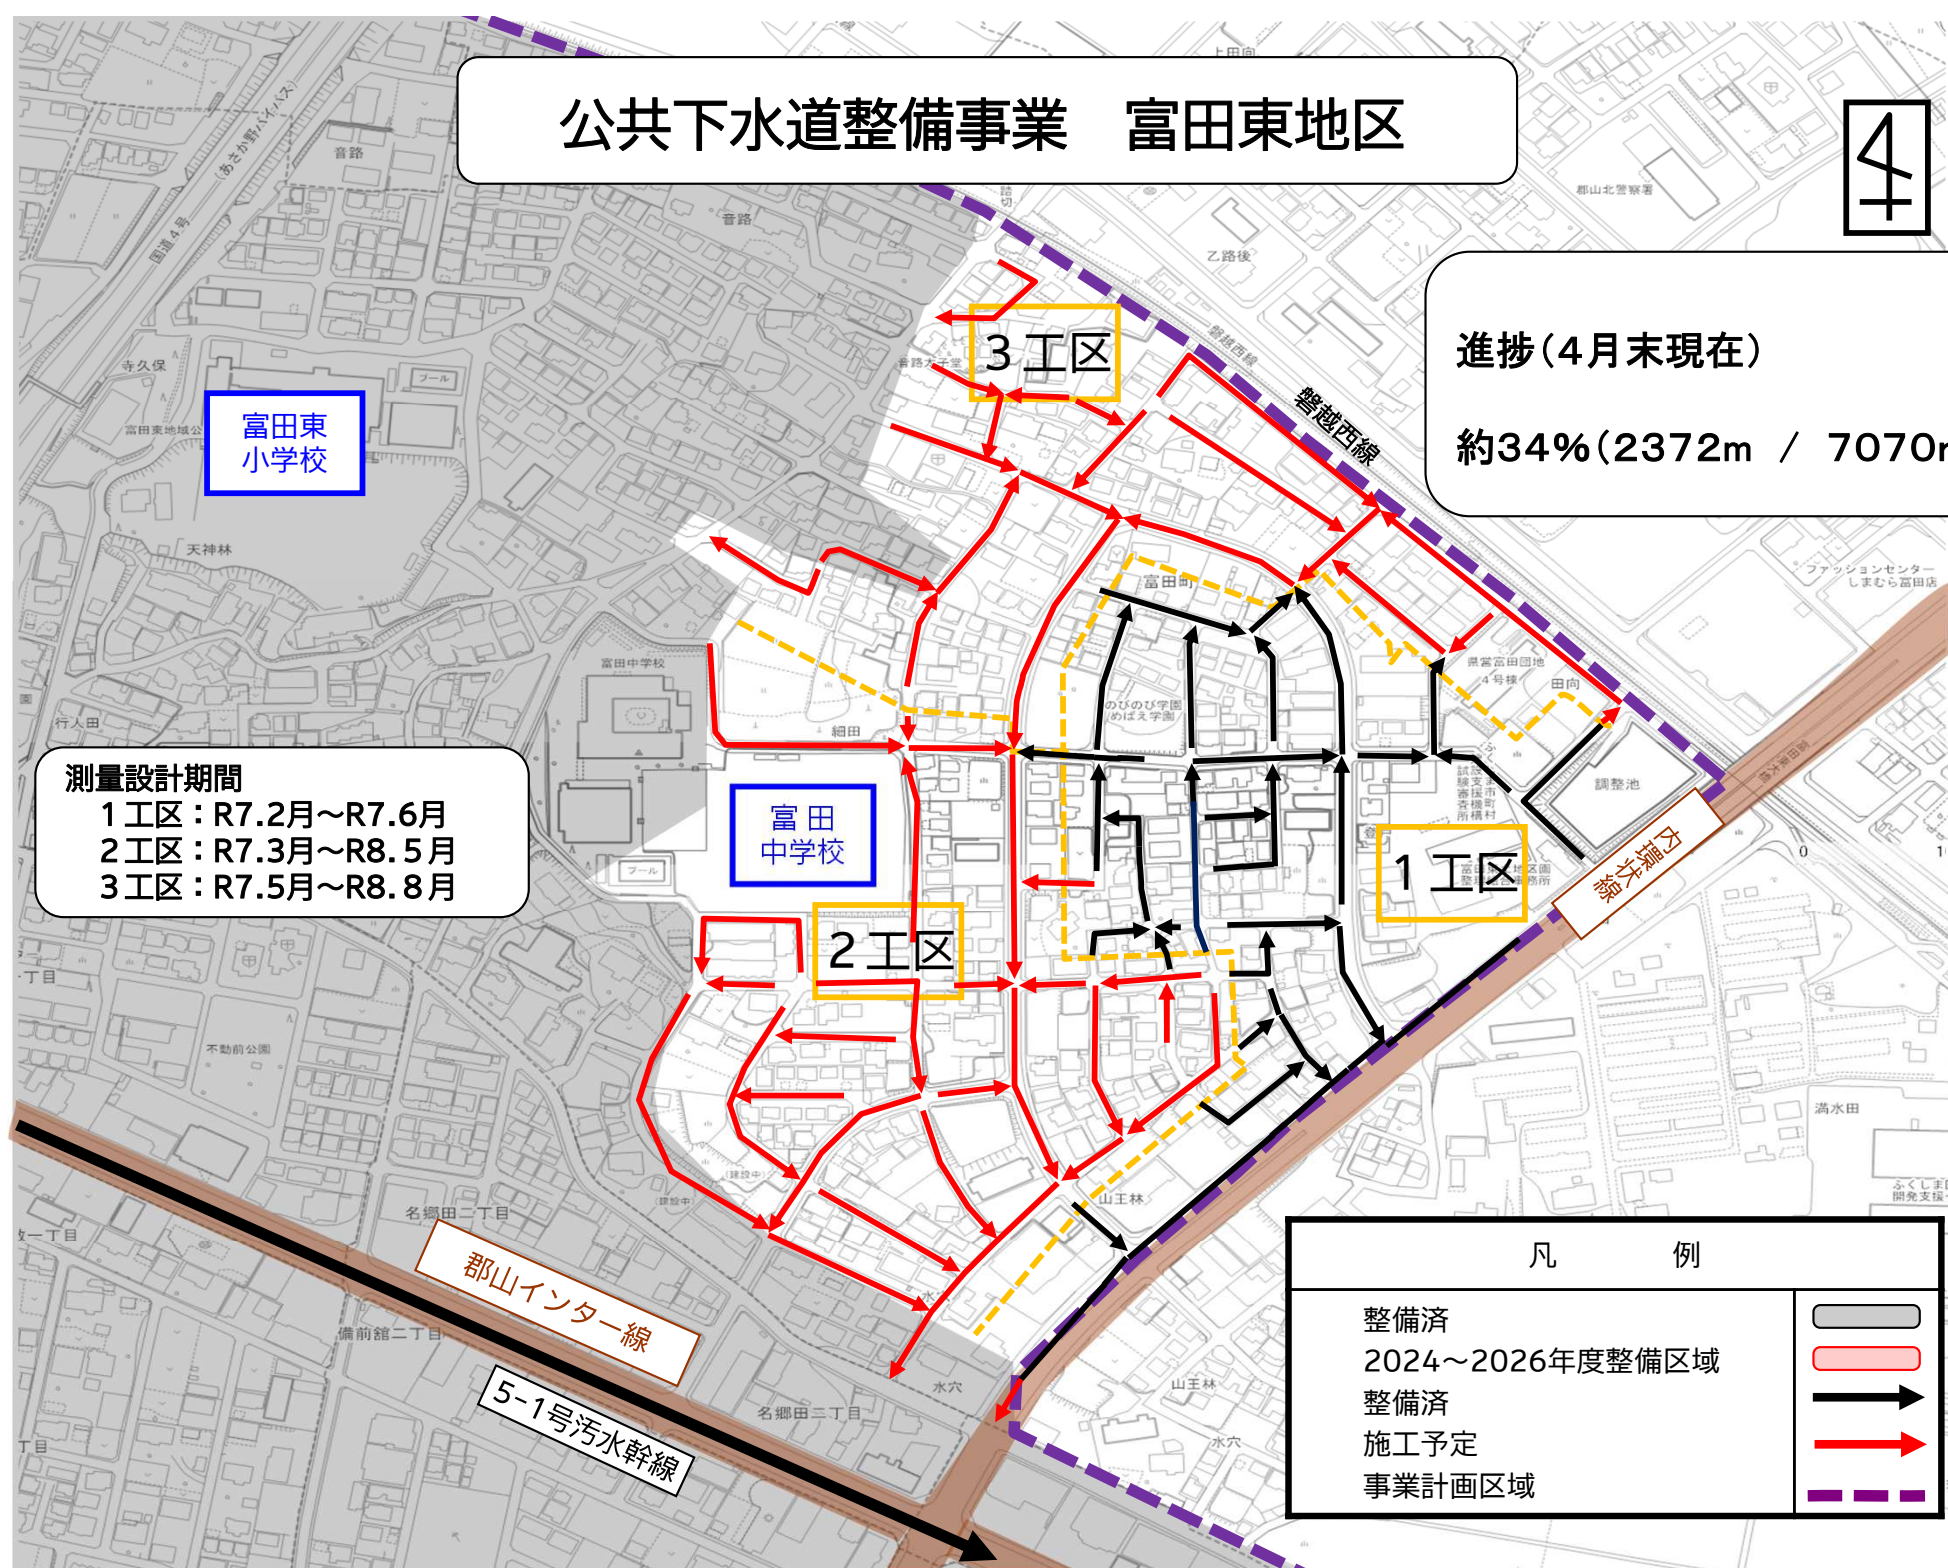

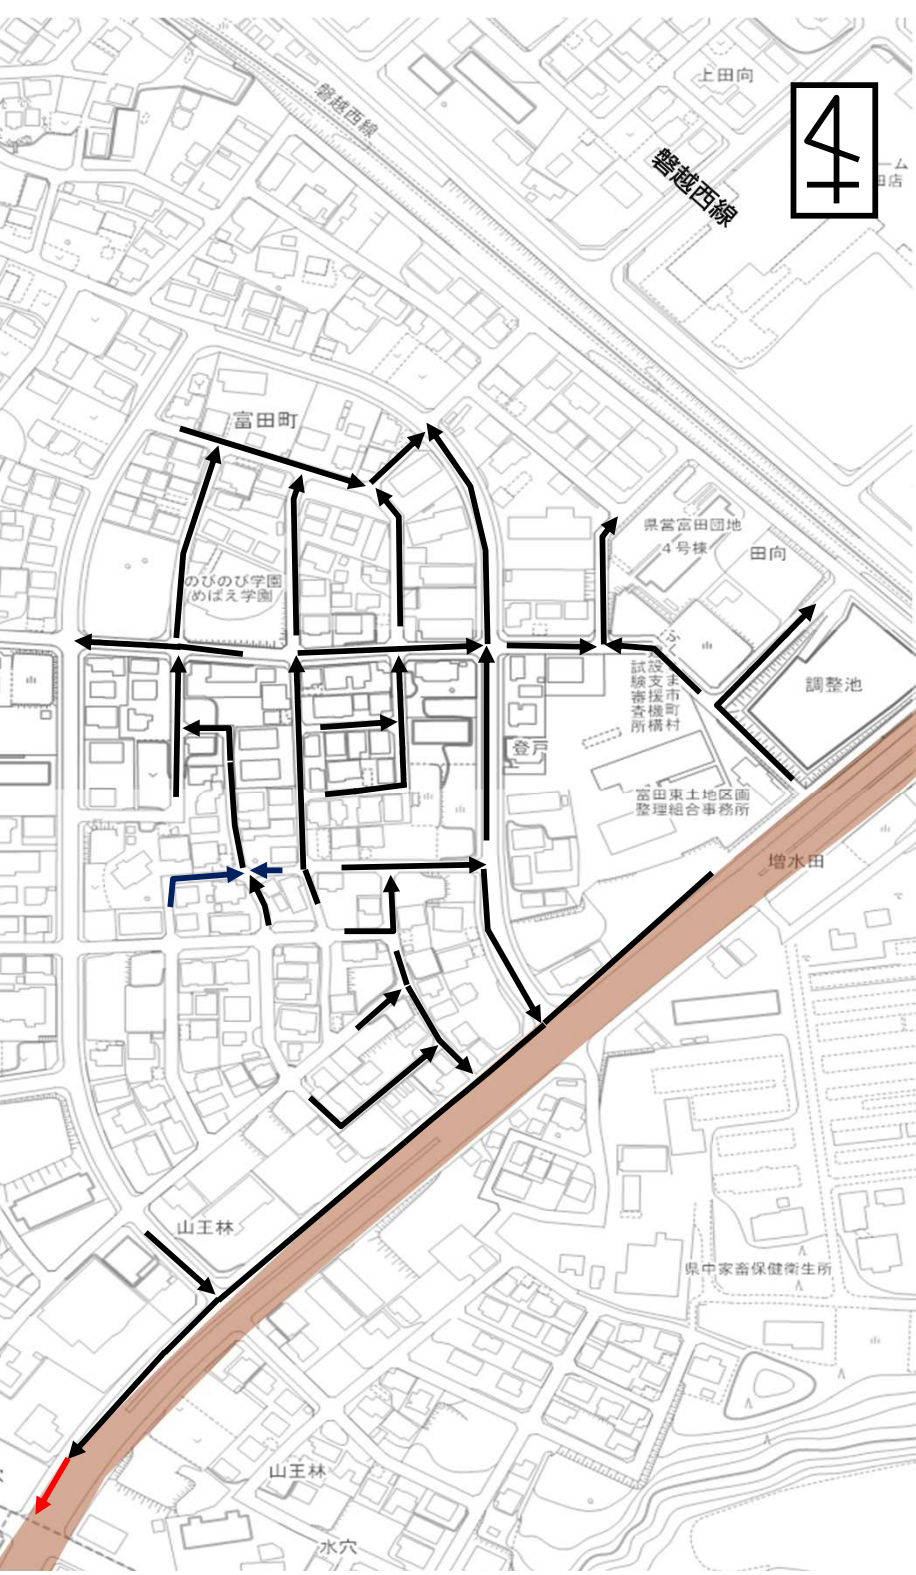

1工区進捗（4月末現在）

→ 下水道本管

施工済み →

管路布設状況

2372m / 2372m

マンホール設置状況

80箇所 / 80箇所

マンホール内
インバート設置状況



汚水柵設置完了



着手から約7ヶ月が過ぎ、皆様のご協力もいただき、工事は順調に進んでおり、下水道本管の施工は100%完了となりました。5月は舗装工事を予定しております。舗装工事の後、区画線復旧工事が終わりますと1工区は施工完了になります。事故等がないようにさらに安全対策に留意してまいりますのでご協力の程よろしくお願いいたします。

※「インバート」とは汚水を上流から下流へスムーズに流すことを目的として、マンホール底部に設置する溝（汚水の通り道）。
