

公共下水道整備事業 富田東地区

4

進捗(6月末現在)

約43%(3024m / 7070m)

測量設計期間

1工区：R7.2月～R7.6月

2工区：R7.3月～R8.5月

3工区：R7.5月～R8.8月

富田東
小学校

富田
中学校

2工区


1工区

3工区

郡山インター線

5-1号污水幹線

凡 例	
整備済	
2024～2026年度整備区域	
整備済	
施工予定	
事業計画区域	

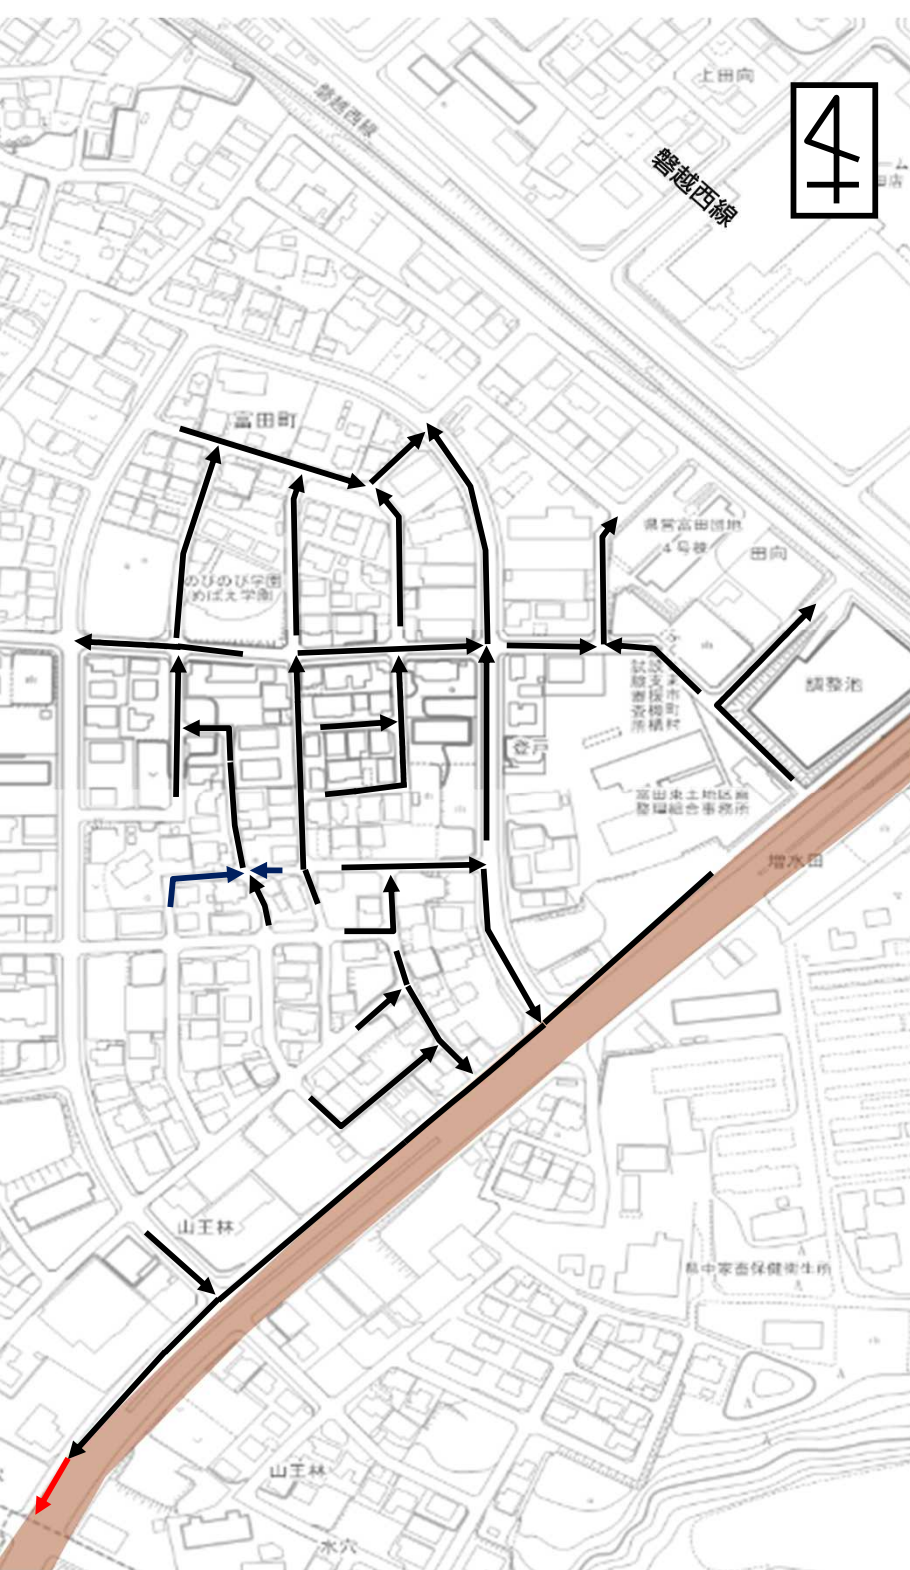

1 工区進捗（6月末現在）

→ 下水道本管

施工済み →

管路布設状況

2372m / 2372m

マンホール設置状況

80箇所 / 80箇所

合材敷均し状況



合材転圧状況



着手から約9ヶ月が過ぎ、皆様のご協力もいただき、工事は順調に進んでおり、下水道本管の施工は100%完了となりました。6月は予定通り舗装工事をおこなっております。7月も引き続き舗装工事を実施する予定です。

事故等がないようにさらに安全対策に留意してまいりますのでご協力の程よろしくお願いいたします。

4

2工区進捗（6月末現在）



下水道本管

施工済み



管路布設状況

652m / 2489m

マンホール設置状況

26箇所 / 79箇所

機械掘削状況

工程	管 路 工
位置	2003+60.6
掘削	
埋戻し	
舗装	

機械掘削状況



土留設置状況

工程	管 路 工
位置	2003+60.6
掘削	
埋戻し	
舗装	

山留材設置完了



現在、2工区にて下水道管の布設工事が本格的に始まり、「既設舗装の撤去」→「道路の掘削」→「下水道管の布設」→「埋戻し」→「舗装の仮復旧」の流れで施工しております。工事中は車の出入り等、皆様にご不便おかけしますが、安全第一で進めてまいりますので、ご協力をお願いいたします。
