

公共下水道整備事業 富田東地区

4

進捗(7月末現在)

約53%(3742m / 7070m)

富田東
小学校

測量設計期間

1工区：R7.2月～R7.6月

2工区：R7.3月～R8.5月

3工区：R7.5月～R8.8月

富田
中学校

1工区

2工区

3工区

郡山インター線

5-1号污水幹線

凡 例


整備済


2024～2026年度整備区域

整備済

施工予定

事業計画区域



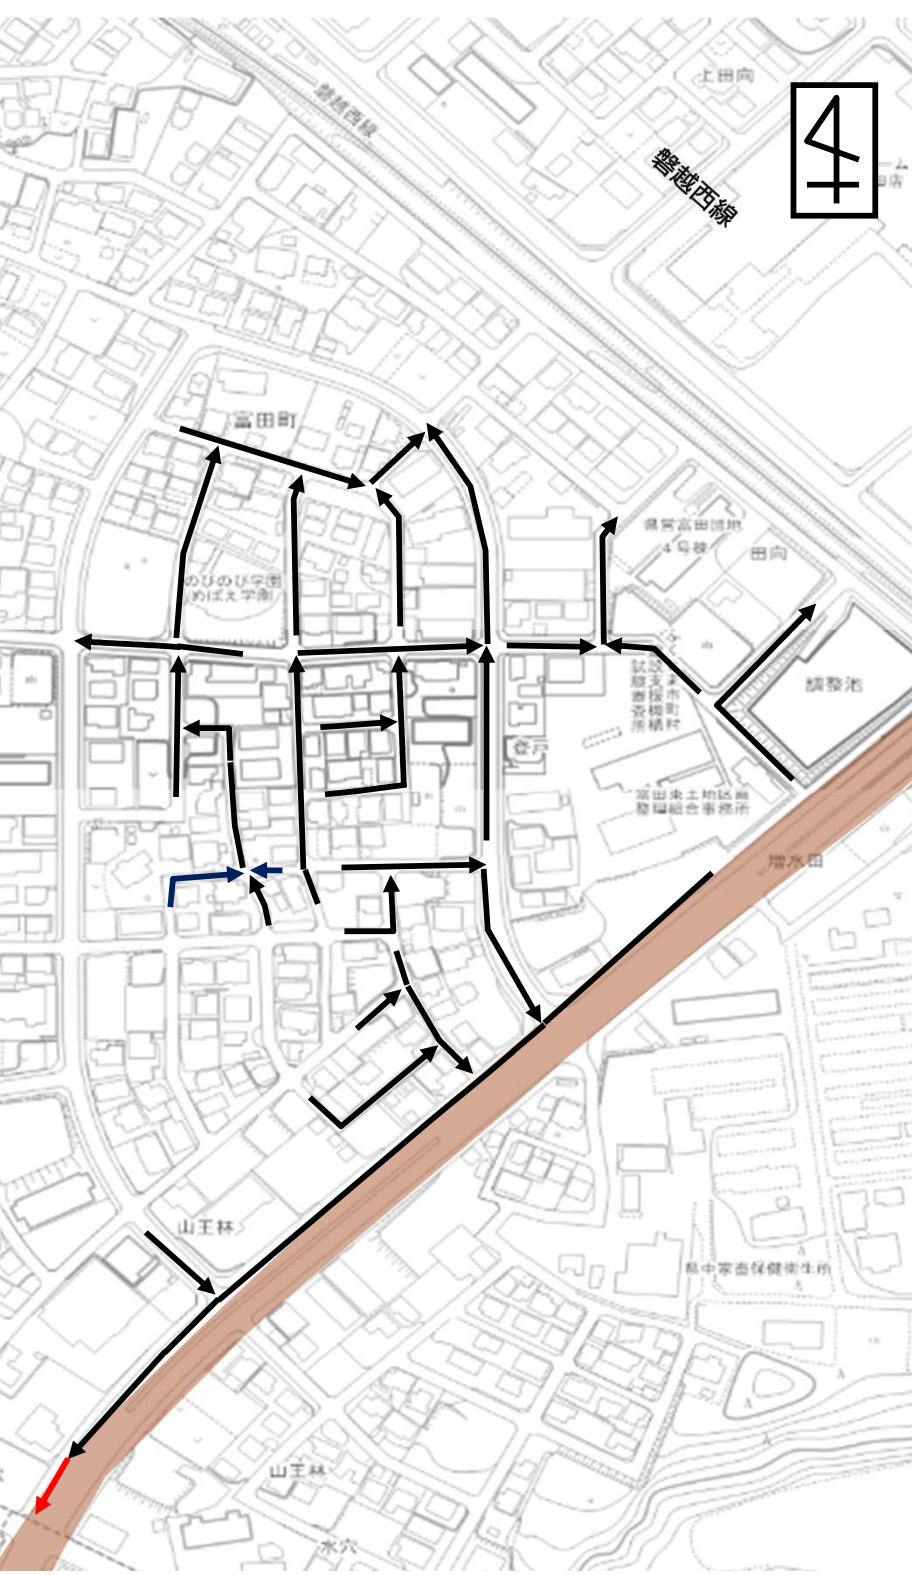

1 工区進捗（7 月末現在）



下水道本管

施工済み



管路布設状況

2372m / 2372m

マンホール設置状況

80箇所 / 80箇所

舗装完了状況



舗装完了状況



着手から約10ヶ月が過ぎ、皆様のご協力もいただき、工事は順調に進んでおり、下水道本管の施工は100%完了となりました。7月末時点にて舗装工事が完了しました。今後の作業は区画線工事のみとなり、8月中の施工を予定しております。

事故等がないようにさらに安全対策に留意してまいりますのでご協力の程よろしくお願いいたします。

4

2工区進捗（7月末現在）

→ 下水道本管

施工済み →

管路布設状況

1370m / 2489m

マンホール設置状況

40箇所 / 79箇所

管布設状況

工事 名称	管路工
位置 （管線 延長 m）	2002+12.0
工事 状況	
管布設状況	

管布設状況

工事 名称	管路工
位置 （管線 延長 m）	2002+12.0
工事 状況	
管布設完了	

現在、2工区にて下水道管の布設工事が本格的に始まり、「既設舗装の撤去」→「道路の掘削」→「下水道管の布設」→「埋戻し」→「舗装の仮復旧」の流れで施工しております。工事中は車の出入り等、皆様にご不便おかけしますが、安全第一で進めてまいりますので、ご協力をお願いいたします。
