

公共下水道整備事業 富田東地区

4

進捗(8月末現在)

約58%(4105m / 7070m)

測量設計期間

1工区：R7.2月～R7.6月

2工区：R7.3月～R8.5月

3工区：R7.5月～R8.8月

富田東
小学校

富田
中学校


1工区


2工区

3工区

郡山インター線

5-1号污水幹線

凡 例	
整備済	
2024～2026年度整備区域	
整備済	
施工予定	
事業計画区域	

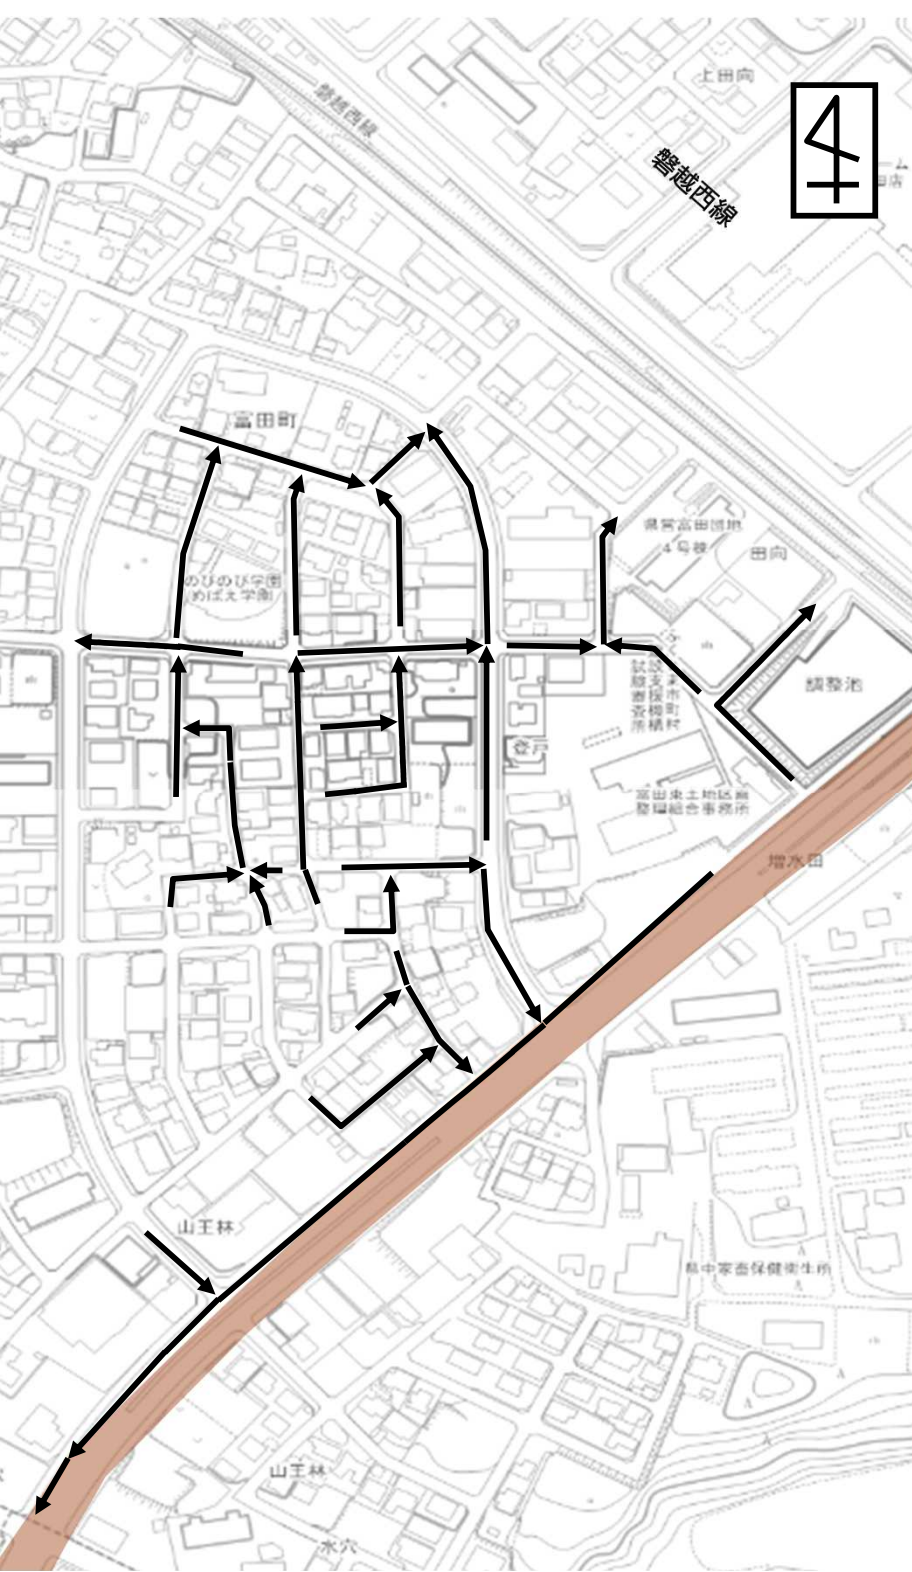

1 工区進捗（8月末現在）

→ 下水道本管

施工済み →

管路布設状況

2372m / 2372m

マンホール設置状況

80箇所 / 80箇所

舗装完了状況



舗装完了状況



着手から約11ヶ月が過ぎ、皆様のご協力をいただき、工事は順調に進み、下水道本管の施工を終え、区画線工事を含め舗装工事も完了しました。

引き続き2工区での施工を行っておりますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。

