

令和6年6月定例会
環境経済常任委員会 説明資料
(P D C Aサイクルの事業進捗報告)

た め 池 防 災 ・ 減 災 事 業

農 林 部

環境経済常任委員会 P D C Aサイクルの事業進捗報告について

事業名：ため池防災・減災事業

■常任委員会への報告フロー

12月定例会	事業概要の説明及び令和5年度事業進捗の報告
--------	-----------------------



3月定例会	令和5年度事業進捗の報告
-------	--------------




6月定例会	令和5・6年度の事業進捗報告
-------	----------------

■6月定例会 説明骨子

令和5・6年度の事業進捗

完了状況、進捗状況、発注予定など

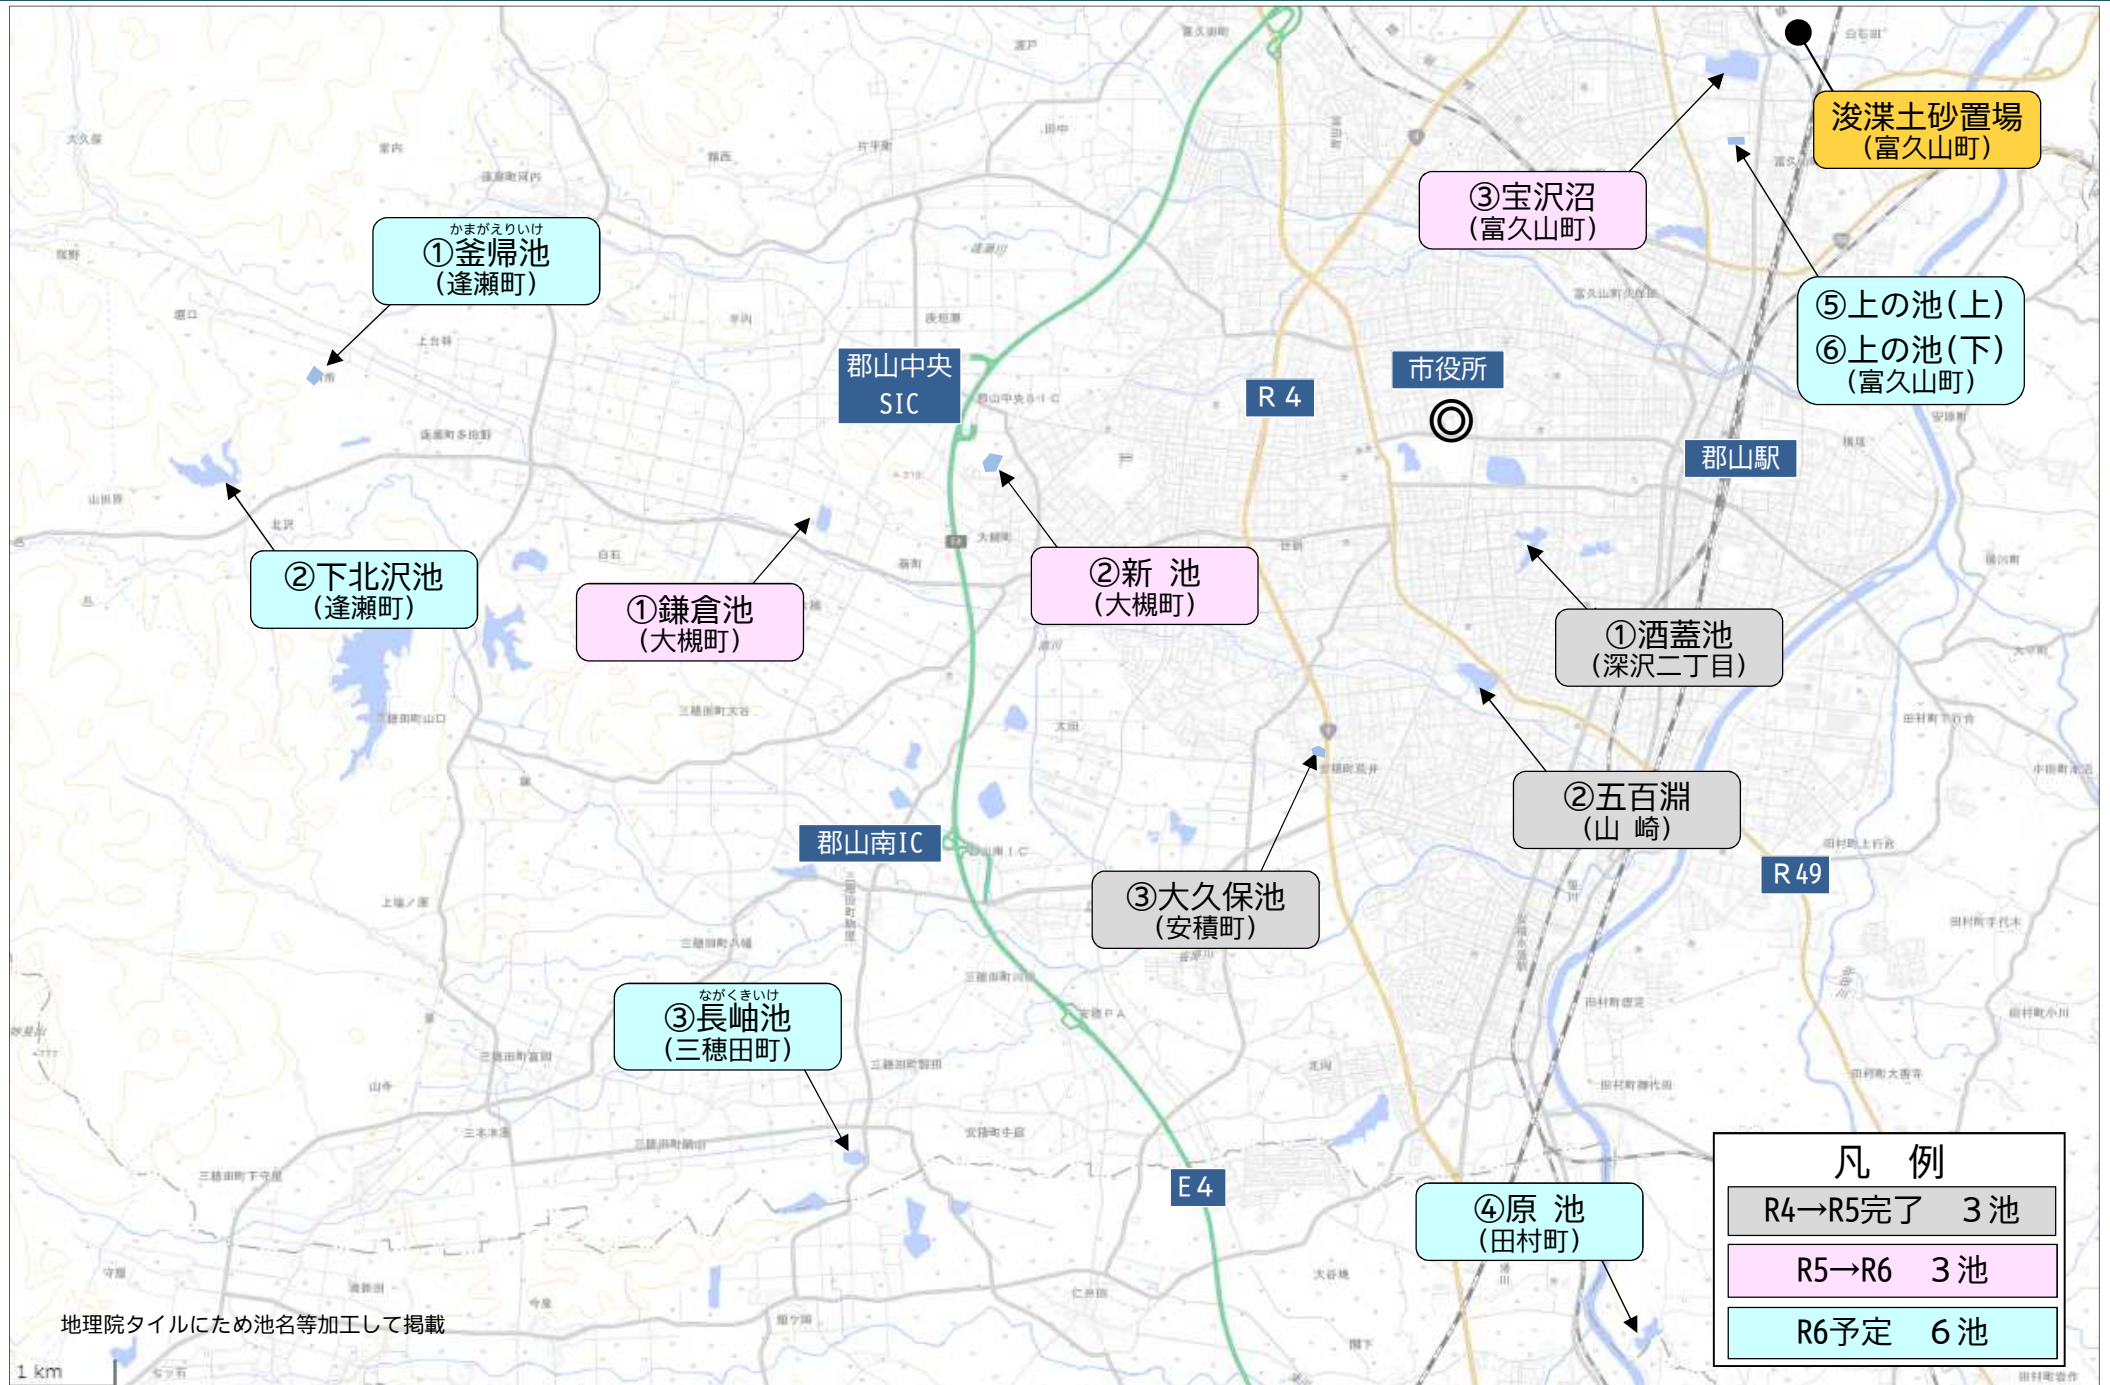

ため池防災・減災事業(P D C A進捗状況報告)

2 / 7

令和4(2022)・5(2023)年度の継続事業(完了)

凡 例

浚渫箇所

対策不要

放流施設

計 画

実施済

実施予定

工事名	①ため池防災・減災事業(酒蓋池)対策工事	対策計画図	工程表
契約番号	第 2022004667号		R 4 年度 R 5 年度
施工箇所	深沢二丁目		10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
工 期	R4.12.16～R6.3.26		
契約金額	¥805,615,800		
受注者	石橋・椎根 特定建設工事共同企業体		
工事概要	施工面積 A=29,550㎡ 浚渫工 V=16,030㎡ 放流施設工N=2基		
進捗状況	R6.3.21 竣工		

工事等名	②ため池防災・減災事業(五百淵)対策工事	対策計画図	工程表
契約番号	第 2022004665号		R 4 年度 R 5 年度
施工箇所	字山崎		10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
工 期	R4.12.16～R6.3.26		
契約金額	¥368,581,400		
受注者	小柳・三栄 特定建設工事共同企業体		
工事概要	施工面積 A=31,800㎡ 浚渫工 V=6,530㎡ 放流施設工N=1基		
進捗状況	R6.3.22 竣工		

工事等名	③ため池防災・減災事業(大久保池)対策工事	対策計画図	工程表
契約番号	第 2022004664号		R 4 年度 R 5 年度
施工箇所	安積町荒井		10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
工 期	R4.12.16～R6.3.15		
契約金額	¥378,898,300		
受注者	壁巢・八光 特定建設工事共同企業体		
工事概要	施工面積 A=12,900㎡ 浚渫工 V=9,290㎡ -		
進捗状況	R6.2.26 竣工		

ため池防災・減災事業(P D C A進捗状況報告)

3 / 7

令和5(2023)・6(2024)年度の継続事業

凡 例

浚渫箇所

対策不要



● 放流施設

—— 計 画

—— 実施済

■■■■ 実施予定

工事名	①ため池防災・減災事業（鎌倉池）対策工事	対策計画図	工程表
契約番号	第 2023002561号		
施工箇所	大槻町字隠居免		
工 期	R5.8.9～R6.11.29		
契約金額	¥134,618,000		
受注者	三栄建設株式会社		
工事概要	施工面積 A=9,680㎡ 浚渫工 V=6,890㎡ 放流施設工N=1基		
進捗状況	50% (R6年5月末)		

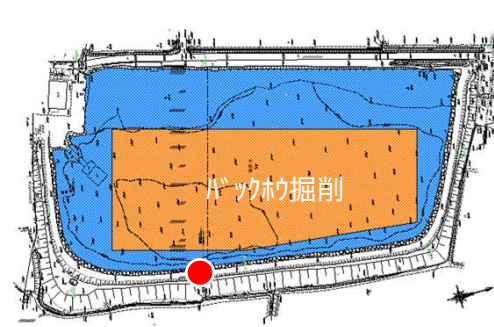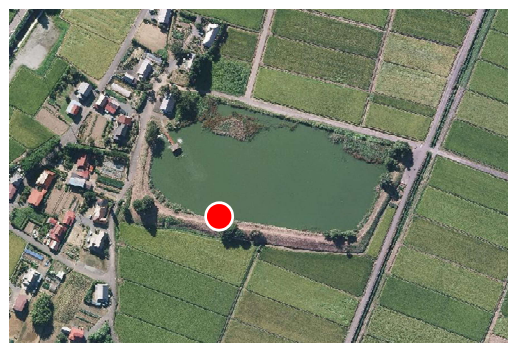


	R 5 年度												R 6 年度											
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
準備工																								
仮設工																								
浚渫工																								
放流施設工																								
跡片付																								




※他水源でかんがい用水を確保し、落水状態での施工

ため池防災・減災事業(P D C A進捗状況報告)

4 / 7

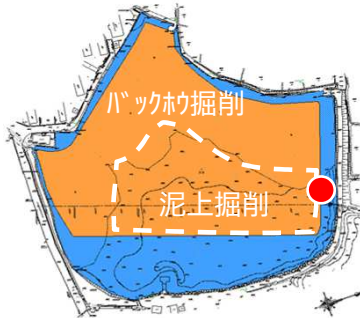令和5(2023)・6(2024)年度の継続事業			凡 例		● 放流施設		—— 計 画		—— 実施済		 実施予定																				
工事等名 ②ため池防災・減災事業（新池）対策工事			対策計画図			工程表		R 5 年度						R 6 年度																	
契約番号	第 2023002577号					準備工		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3						
施工箇所	大槻町字中ノ平南					浚渫工																									
工 期	R5.10.10～R7.3.17					仮設工																									
契約金額	¥341,792,000					放流施設工																									
受注者	小柳・三栄					跡片付																									
工事概要	特定建設工事共同企業体																														
	施工面積 A=27,160㎡																														
進捗状況	浚渫工 V=18,200㎡																														
	放流施設工N=1基																														
30% (R 6 年 5 月末)																															

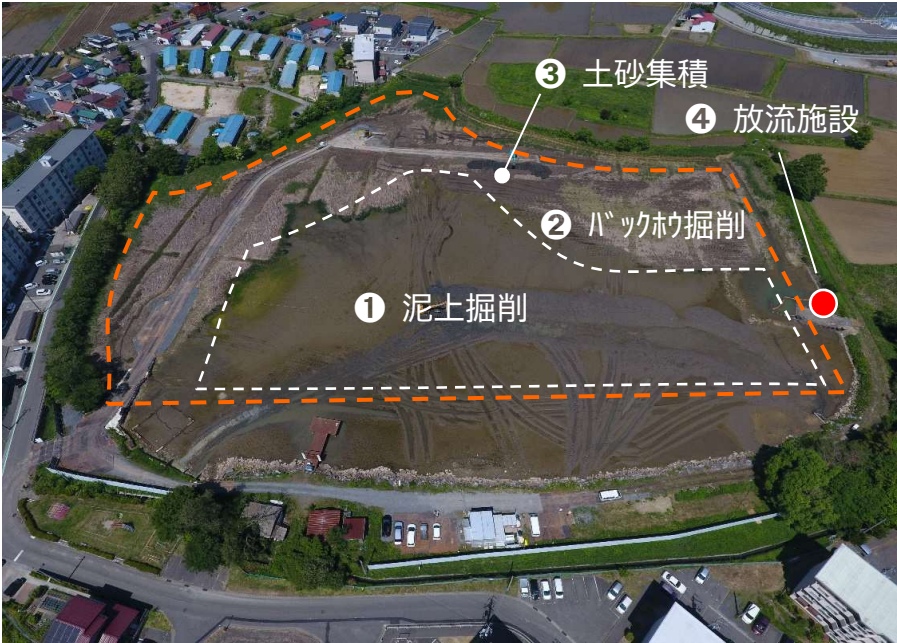

※必要なかんがい用水を確保し、低水位状態での施工



ため池防災・減災事業(P D C A進捗状況報告)

5 / 7

令和5(2023)・6(2024)年度の継続事業

凡 例

浚渫箇所


対策不要

放流施設

計画


実施済

実施予定

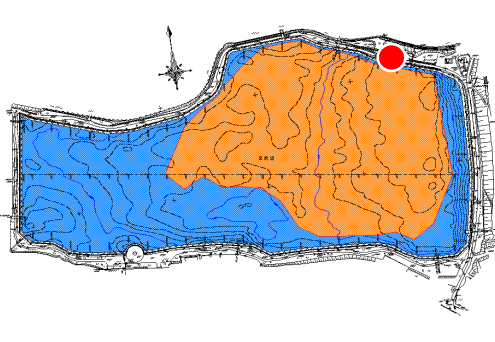工事等名	③ため池防災・減災事業(宝沢沼)対策工事		対策計画図	工程表	R 5 年度			R 6 年度											
契約番号	第 2023002589号			準備工	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
施工箇所	富久山町福原			仮設工															
工 期	R5.10.10~R7.3.17			浚渫工															
契約金額	¥748,678,700			放流施設工															
受注者	壁巣・森尾興発 特定建設工事共同企業体			跡片付															
工事概要	施工面積 A=43,740㎡ 浚渫工 V=16,000㎡ 放流施設工N=1基																		
進捗状況	20% (R6年5月末)																		



※必要なかんがい用水を確保し、満水位状態での施工

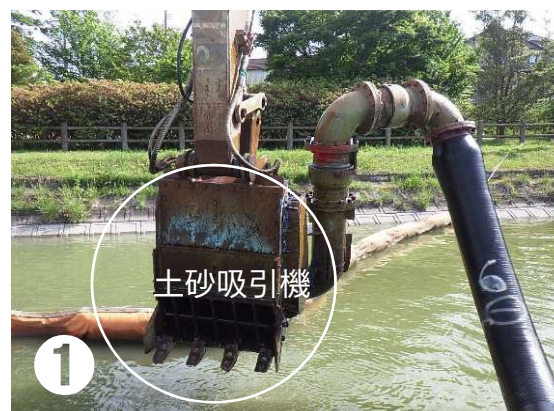

浚渫土砂置場 (富久山町福原地内・市有地) 置場容量 約8万 m^3



※令和5年度末 搬入土量31,850 m^3 (面積1万 m^2 ・盛土高さ3m) 25mプール 約50杯相当

ため池防災・減災事業(P D C A進捗状況報告)

7 / 7

令和6(2024)年度の事業予定



凡 例

浚渫箇所


対策不要

放流施設


① ため池防災・減災事業(釜帰池) 対策工事 施工箇所 逢瀬町多田野
入札予定 R6年8月 施工概要 面積A=3,100㎡ 浚渫工V=1,700㎡ 放流施設工N=1基

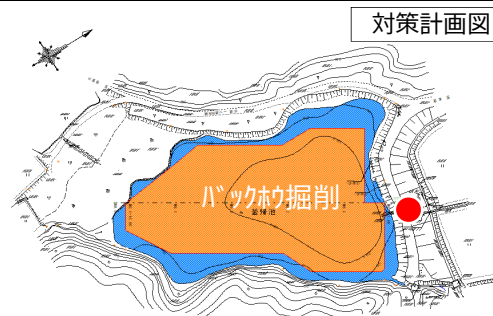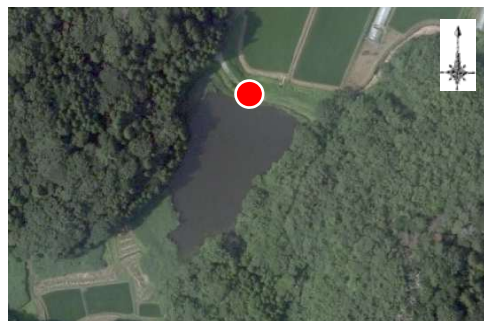



④ ため池防災・減災事業(原池) 対策工事 施工箇所 田村町御代田
入札予定 R6年8月 施工概要 放流施設工N=1基

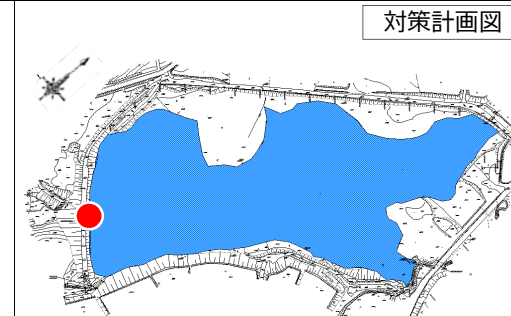


② ため池防災・減災事業(下北沢池) 対策工事 施工箇所 逢瀬町多田野
入札予定 R6年8月 施工概要 放流施設工N=1基

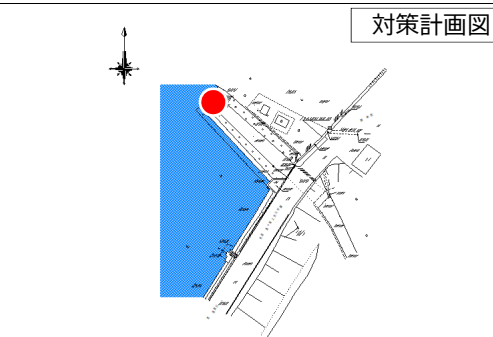

⑤ ため池防災・減災事業(上の池(上)) 対策工事 施工箇所 富久山町福原
入札予定 R6年8月 施工概要 面積A=8,500㎡ 浚渫工V=4,540㎡ 放流施設工N=1基

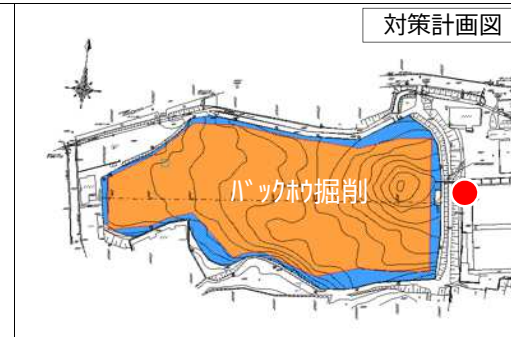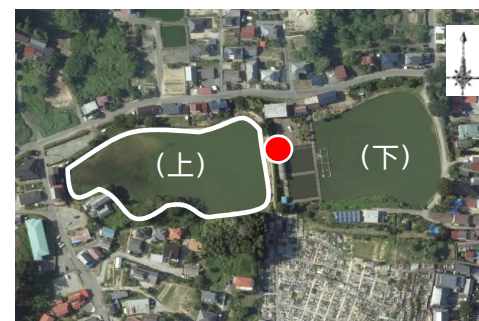

③ ため池防災・減災事業(長岫池) 対策工事 施工箇所 三穂田町野田
入札予定 R6年8月 施工概要 面積A=7,600㎡ 浚渫工V=4,200㎡

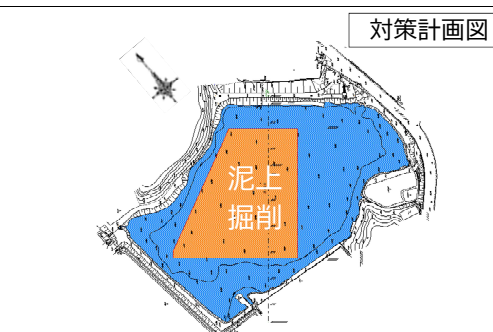

⑥ ため池防災・減災事業(上の池(下)) 対策工事 施工箇所 富久山町福原
入札予定 R6年8月 施工概要 放流施設工N=1基

