

令和6年9月定例会

環境経済常任委員会 説明資料

(P D C Aサイクルの事業進捗報告)

た め 池 防 災 ・ 減 災 事 業

環境経済常任委員会 P D C Aサイクルの事業進捗報告について

事業名：ため池防災・減災事業

■常任委員会への報告フロー

令和5年12月定例会	事業概要の説明 令和5年度事業進捗の報告
令和6年3月定例会	令和5年度事業進捗の報告
令和6年6月定例会	令和5・6年度の事業進捗報告




令和6年9月定例会	令和6年度事業進捗の報告
-----------	--------------

■9月定例会 説明骨子

令和6年度の事業進捗、発注状況など

農 林 部

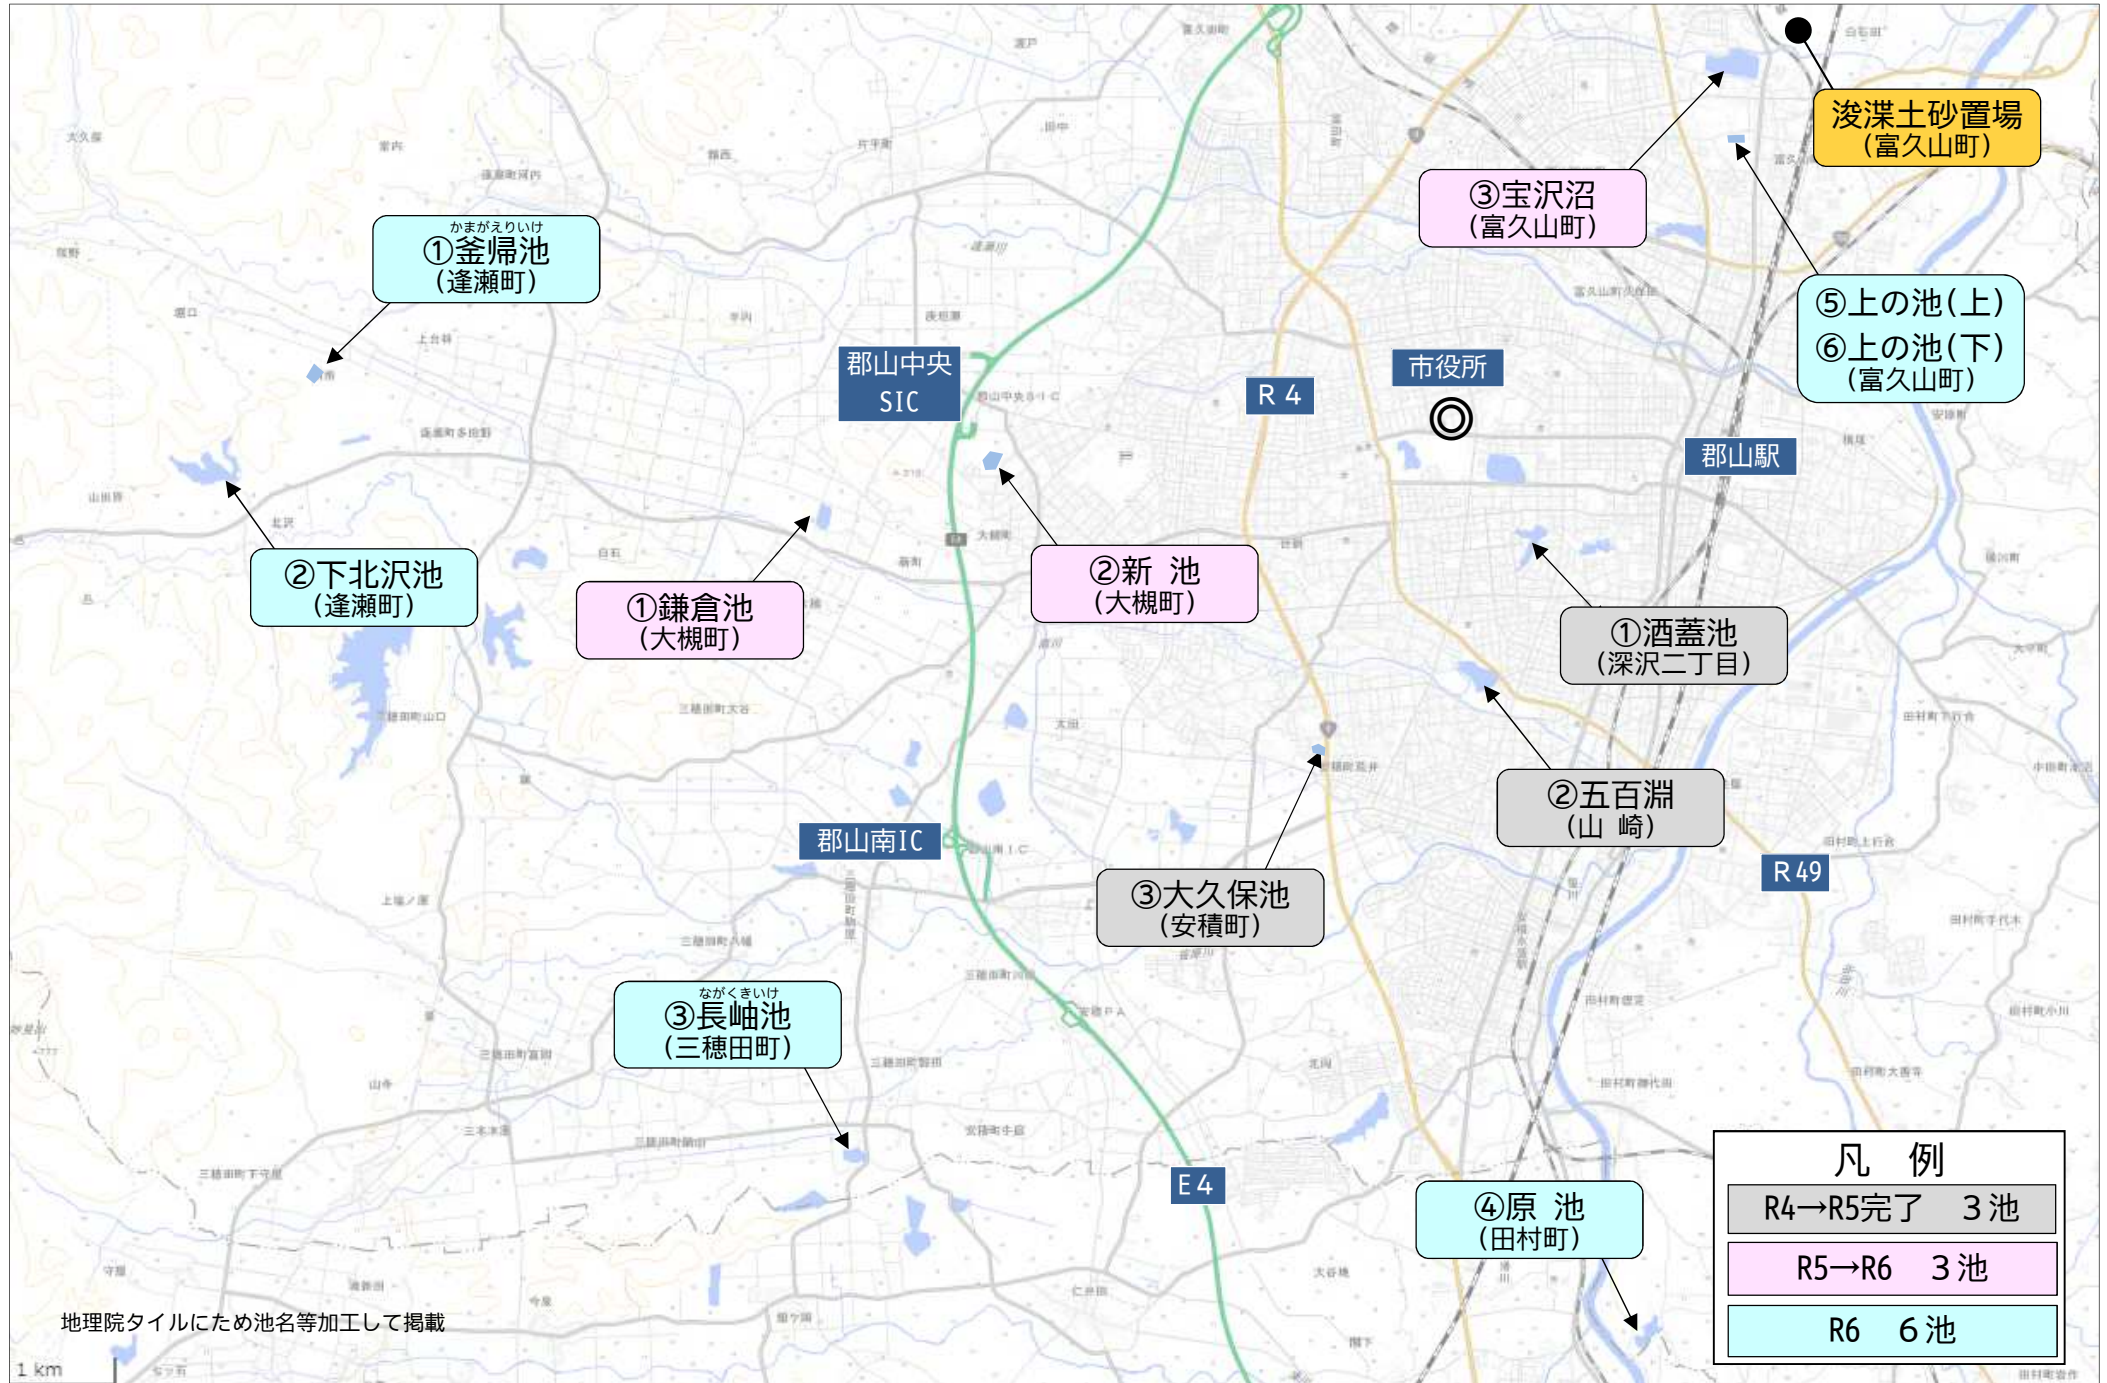



ため池防災・減災事業(P D C A進捗状況報告)

2 / 7

令和 5 (2023) ・ 6 (2024) 年度の継続事業

凡 例

浚渫箇所

対策不要


放流施設


計 画

実施済


実施予定

工事名	①ため池防災・減災事業（鎌倉池）対策工事	
契約番号	第 2023002561号	
施工箇所	大槻町字隠居免	
工 期	R5.8.9～R6.11.29	
変更契約	R6.8.19	
契約金額	¥134,618,000→132,619,300	
受注者	三栄建設株式会社	
工事概要	施工面積A=9,680→9,720㎡	
	浚渫工V=6,890→7,047㎡	
	放流施設工N=1基	
進捗状況	90%（R6年8月末）	

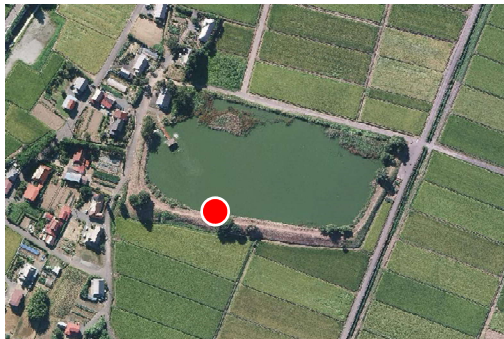


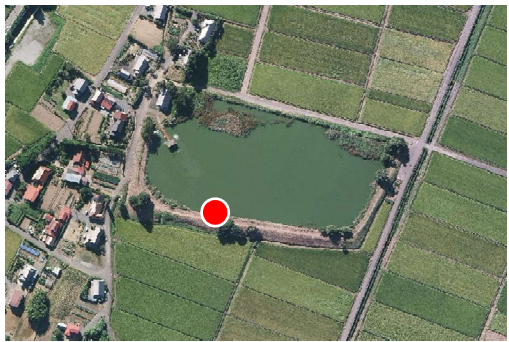


対策計画図

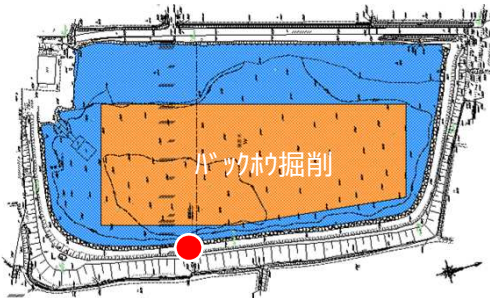

工程表

	R 5 年度												R 6 年度											
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
準備工																								
仮設工																								
浚渫工																								
放流施設工																								
跡片付																								

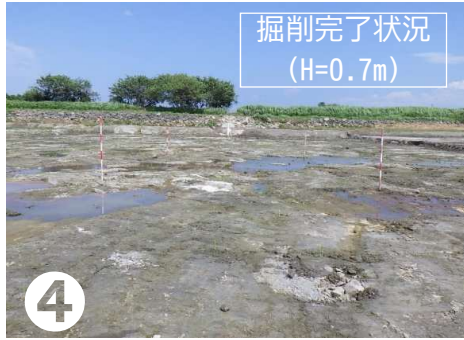



## 3 / 7

■ ■ ■ ■ ■ 実施予定

4

掘削完了状況  
(H=0.7m)



# ため池防災・減災事業(P D C A進捗状況報告)

4 / 7

## 令和5(2023)・6(2024)年度の継続事業

凡 例

浚渫箇所


対策不要

● 放流施設

—— 計 画

—— 実施済

■■■■ 実施予定

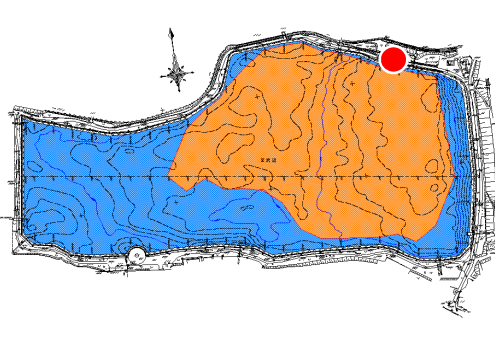工事等名	③ため池防災・減災事業（宝沢沼）対策工事		対策計画図		工程表	R 5 年度			R 6 年度															
契約番号	第 2023002589号				準備工	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
施工箇所	富久山町福原																							
工 期	R5.10.10～R7.3.17																							
契約金額	¥748,678,700																							
受注者	壁巣・森尾興発 特定建設工事共同企業体																							
工事概要	施工面積 A=43,740㎡																							
	浚渫工 V=16,000㎡																							
	放流施設工N=1基																							
進捗状況	40%（R6年8月末）				跡片付																			



※必要なかんがい用水を確保し、満水位状態での施工



# ため池防災・減災事業(P D C A進捗状況報告)

5 / 7

## 令和6(2024)年度の事業

凡 例

浚渫箇所


対策不要


● 放流施設


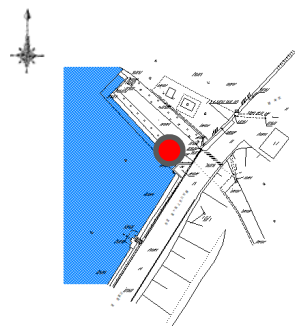
—— 計 画

—— 実施済

■■■■ 実施予定

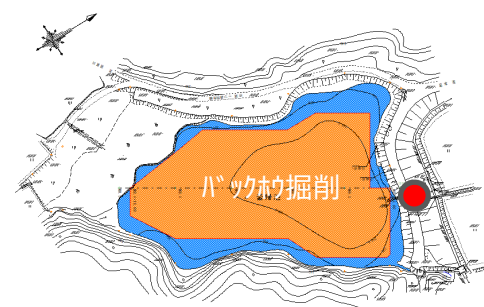工事名	①ため池防災・減災事業（釜帰池）対策工事		対策計画図	工程表	R 6 年度												R 7 年度											
契約番号	第 2024003199号			準備工	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1						
施工箇所	逢瀬町多田野			仮設工																								
工 期	R 6.9.24～R 7.5.30			浚渫工																								
契約金額	¥42,929,700			放流施設工																								
受注者	壁巢建設株式会社			跡片付																								
工事概要	施工面積 A=3,100㎡ 浚渫工 V=1,550㎡ 放流施設工N=1基																											
進捗状況	請負契約(R6.9.20)																											

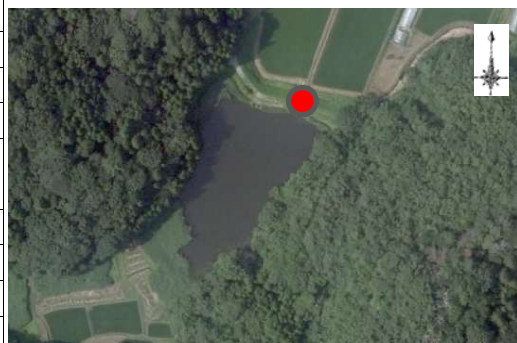

工事等名	②ため池防災・減災事業（下北沢池）対策工事		対策計画図	工程表	R 6 年度												R 7 年度											
契約番号	第 2024003164号					8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1					
施工箇所	逢瀬町多田野				準備工																							
工 期	R 6.9.24～R 7.3.14				仮設工																							
契約金額	¥11,334,400				放流施設工																							
受注者	株式会社小川重工業				跡片付																							
工事概要	放流施設工N=1基																											
進捗状況	請負契約(R6.9.20)																											



工事等名	③ため池防災・減災事業（長岫池）対策工事		対策計画図	工程表	R 6 年度								R 7 年度									
契約番号	第 2024002871号			準備工	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
施工箇所	三穂田町野田			仮設工																		
工 期	R6.9.6～R7.3.14			浚渫工																		
契約金額	¥121,238,700			跡片付																		
受注者	壁巢建設株式会社																					
工事概要	施工面積 A=7,400㎡ 浚渫工 V=3,810㎡																					
進捗状況	準 備 工																					



# ため池防災・減災事業(P D C A進捗状況報告)

6 / 7

## 令和6(2024)年度の事業

凡 例

浚渫箇所

対策不要


● 放流施設

—— 計 画



—— 実施済

■■■■ 実施予定



工事名	④ため池防災・減災事業（原池）対策工事	対策計画図	工程表	R 6年度	R 7年度
契約番号	第 2024002380号			8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1	
施工箇所	田村町御代田		準備工	■	
工 期	R 6.8.23～R 7.3.14			■	
契約金額	¥31,259,800		仮設工	■■■	
受注者	みほた建設株式会社		放流施設工	■■■■■	
工事概要	放流施設工N=1基		跡片付	■	
進捗状況	準備工				

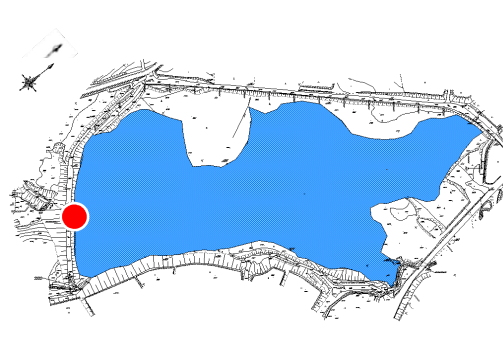

工事等名	⑤ため池防災・減災事業（上の池(上)）対策工事	対策計画図	工程表	R 6年度	R 7年度
契約番号	第 2024002349号			8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1	
施工箇所	富久山町福原		準備工	■■■	
工 期	～R 8.1.30		仮設工	■■■	
契約金額	¥159,632,000		浚渫工	■■■■■	
受注者	三栄建設株式会社		放流施設工	■■■■■	
工事概要	施工面積 A=8,500㎡ 浚渫工 V=4,540㎡ 放流施設工N=1基		跡片付	■	
進捗状況	9月定例会議案				

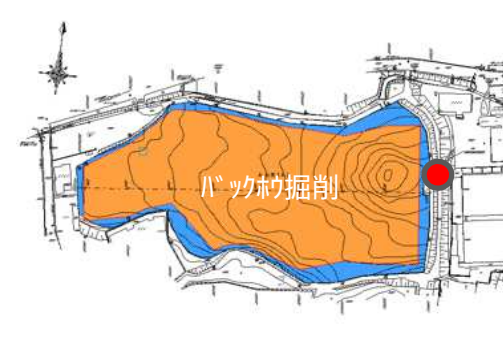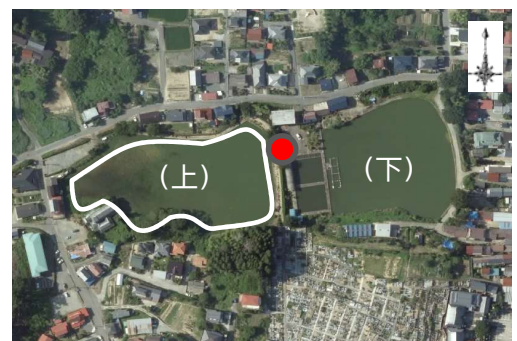

工事等名	⑥ため池防災・減災事業（上の池(下)）対策工事	対策計画図	工程表	R 6年度	R 7年度
契約番号	第 2024003175号			8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1	
施工箇所	富久山町福原		準備工	■■■	
工 期	R 6.9.24～R 7.5.30		仮設工	■■■	
契約金額	¥29,957,400		放流施設工	■■■■■	
受注者	合資会社共立社		跡片付	■	
工事概要	放流施設工N=1基				
進捗状況	請負契約(R6.9.20)				

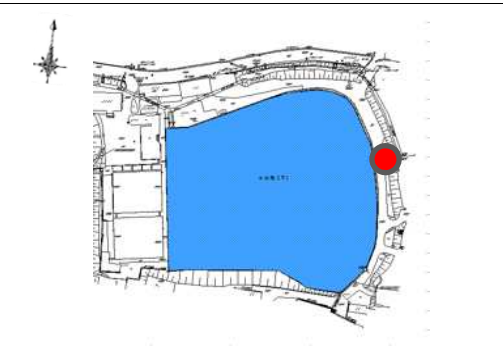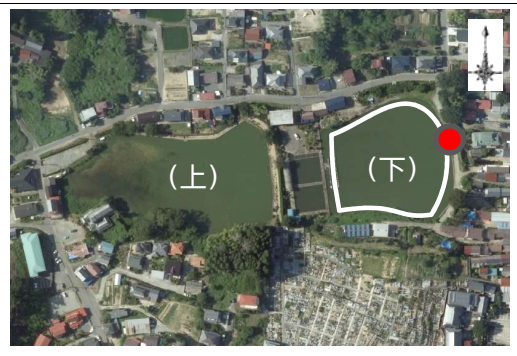



## 浚渫土砂置場（富久山町福原地内・市有地）置場容量 約8万m<sup>3</sup>



※令和6年8月末の搬入土量: 4万9千m<sup>3</sup>(面積1万m<sup>2</sup>・盛土高さ5m)25mプール 約80杯相当  
 令和5年度末の搬入土量: 3万2千m<sup>3</sup>(酒蓋池・五百淵・大久保池)  
 令和6年度の搬入土量: 1万7千m<sup>3</sup>(鎌倉池・新池・宝沢沼)
