

# 石塚貯留管築造工事 工事状況

令和4年7月末 進捗率 約54%

7月は、推進用ヒューム管施工（推進工）（施工延長約400m完了）、7月14日に見学会を行いました。  
8月は、引き続き、推進用ヒューム管施工（推進工）を行います。




概要説明

現場見学会状況



現場見学


現場見学会状況

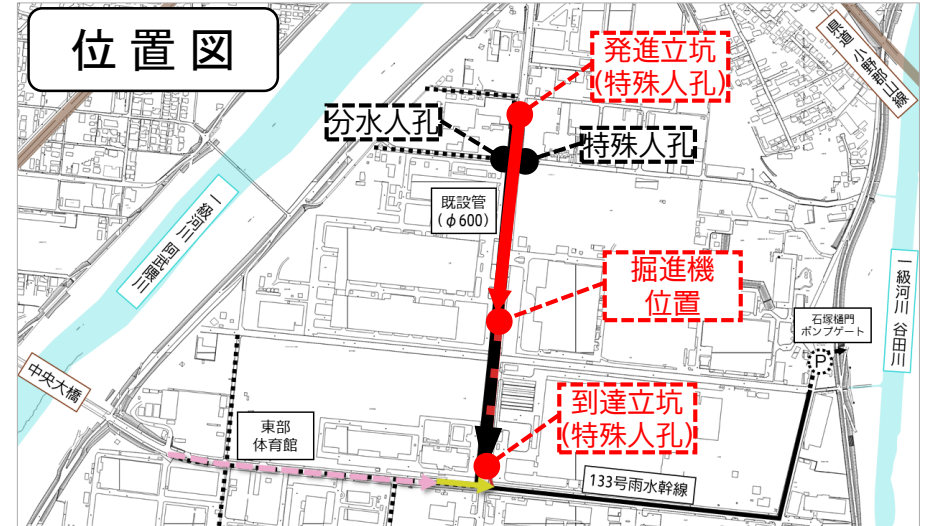


位置図



ヒューム管推進状況

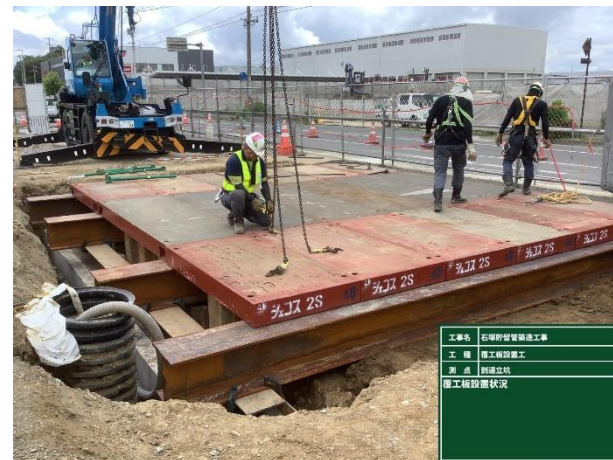

覆工板設置状況（到達立坑）

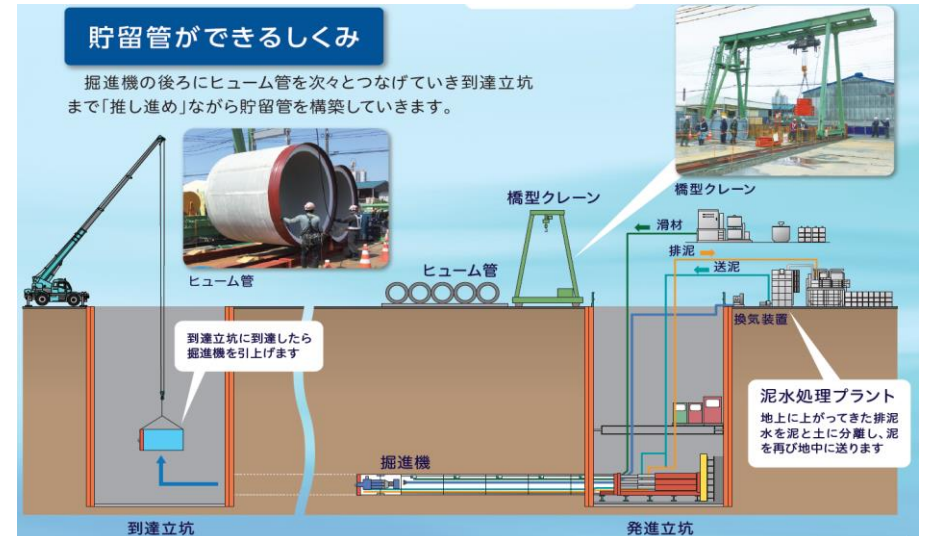

貯留管ができるしくみ

掘進機の後ろにヒューム管を次々とつなげていき到達立坑まで「推し進め」ながら貯留管を構築していきます。

到達立坑に到達したら掘進機を上げます

泥水処理プラント  
地上に上がってきた排泥水を泥と土に分離し、泥を再び地中に送ります
