

# 小原田貯留管築造工事 工事完了

令和4年12月末 進捗率 100%

12月は、植栽や復旧、現場の跡片付け等を行い、小原田貯留管築造工事が完了し、雨水貯留施設としての一時貯留、ポンプ排水が可能な状態となりました。本工事へのご理解とご協力ありがとうございました。



池田公園全景




No.3分水人孔可動堰 (落合堀雨水幹線)



貯留管内部状況



No.6分水人孔排水ポンプ

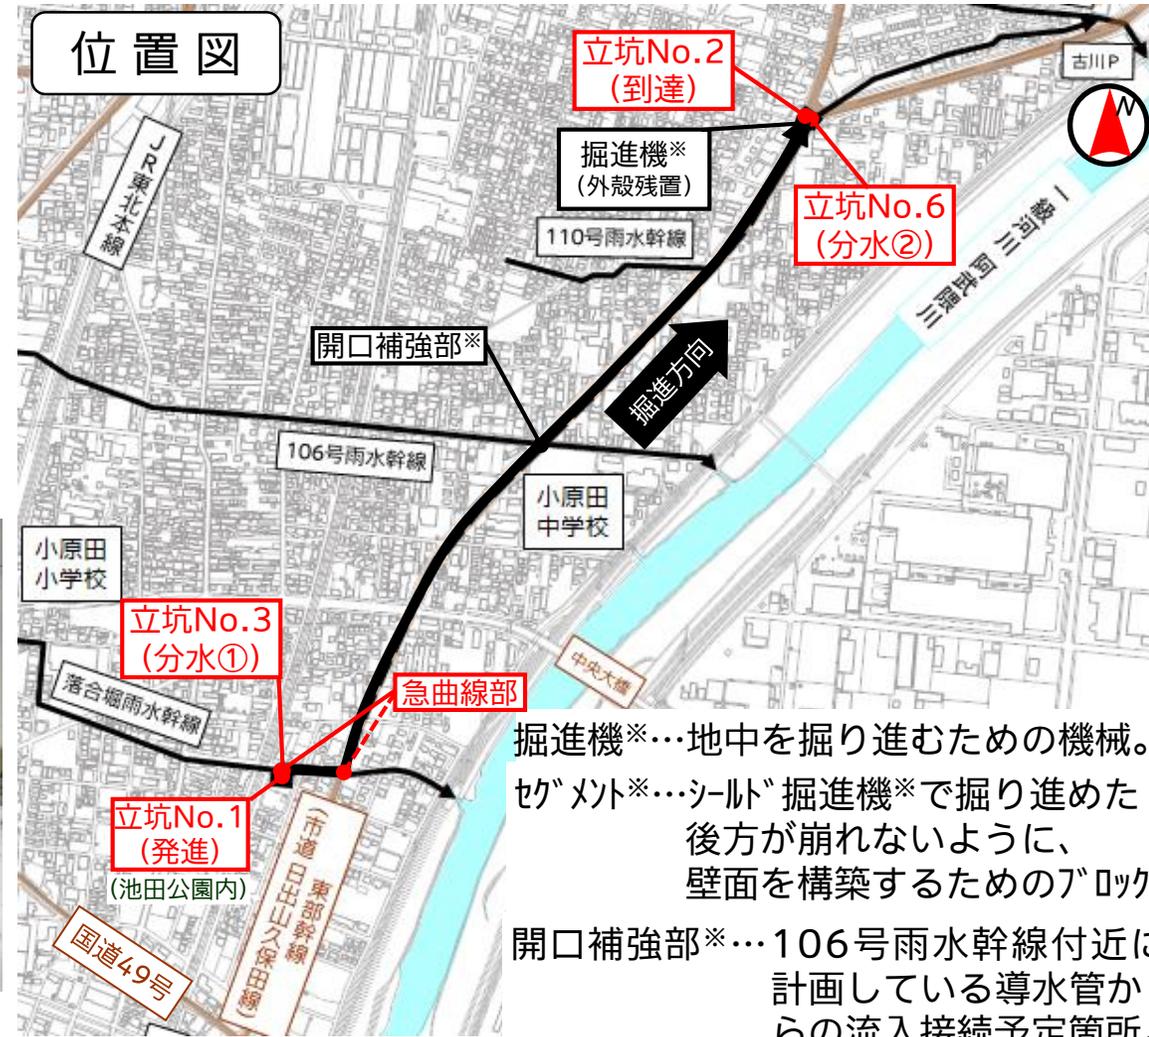

掘進機※…地中を掘り進むための機械。  
セグメント※…シールド掘進機※で掘り進めた後方が崩れないように、壁面を構築するためのブロック。  
開口補強部※…106号雨水幹線付近に計画している導水管からの流入接続予定箇所。
