




1 事業の目的

○本市の豊かな歴史・文化遺産を保存・整備活用し、情報発信するとともに、市民共有の知的資源としての歴史的公文書等の適切な管理と次世代へ継承していくための拠点施設整備を目的に、「郡山市歴史情報博物館」を整備する。

2 事業概要

○歴史資料・文化財を収集・保管し次世代へ継承するとともに、その活用及び情報発信を図りながら、中央図書館の機能を連携させ、市民の皆様の郷土愛をより一層醸成するための施設整備を進める。  
○2024年度（令和6年度）は、郡山市歴史情報博物館の建設工事を進めるとともに、展示エリアの展示製作を実施する。また、周辺道路の整備を行うとともに、歴史資料館跡地を公会堂前広場として整備する。

3 スケジュール

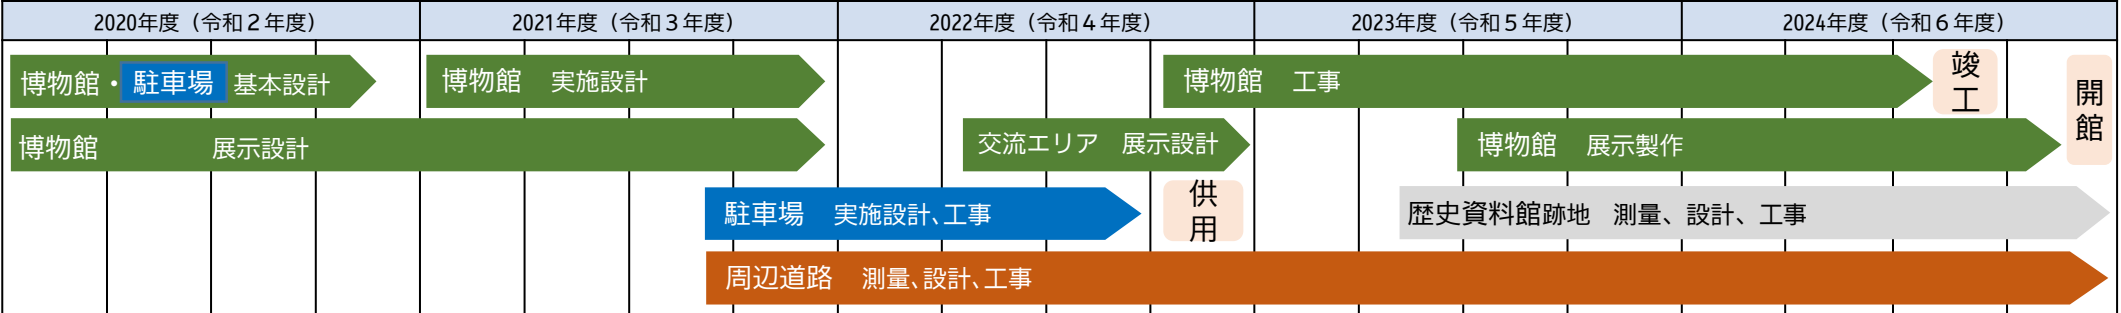

2024年度（令和6年度）スケジュール

| 4月 | 5月                      | 6月                              | 7月                                                      | 8月                                                                          | 9月                                | 10月                                                                                                                     | 11月                 | 12月                                                                                  | 1月                  | 2月                                                   | 3月                                                                                                |
|----|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | ○博物館主体工事外3件<br>5/14変更契約 | ○中央公民館テレビ電波障害<br>防除工事完了<br>6/28 | ○麓山一丁目10号線道路改良工事<br>契約7/19<br>○公会堂前広場<br>整備工事契約<br>7/23 | ○歴史資料館解体<br>工事完了8/2<br>○博物館主体工事<br>外4件変更契約<br>8/22<br>※工期延長<br>～8/30→～10/11 | ○麓山地区立体<br>駐車場通路<br>整備工事契約<br>9/9 | ○案内標識設置工事<br>契約10/1<br>○博物館主体工事外<br>4件完了10/11<br>(引渡し式10/25)<br>○歴史文化遺フォー<br>ラム開催10/19<br>○麓山一丁目虎丸町<br>線改良工事契約<br>10/31 | ○複製品製作委託<br>完了11/29 | ○麓山地区立体<br>駐車場通路整備<br>工事完了12/13<br>○複製品製作委託<br>完了12/20<br>○博物館収蔵棚<br>設置工事完了<br>12/27 | ○案内標識設置<br>工事完了2/20 | ○麓山一丁目10号<br>線道路改良工事<br>完了2/17<br>○複製品製作委託<br>完了2/18 | ○公会堂前広場整備<br>工事完了3/14<br>○麓山一丁目虎丸<br>町線改良工事完了<br>3/14<br>○展示製作等業務<br>委託（展示造作完了）<br>○博物館開館<br>3/15 |


4 2024年度（令和6年度）予算額及び執行内容（令和6年12月5日現在）

単位：千円

| 事業区分                        | 予算額       | 執行額       | 執行残額    | 執行額(内訳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 設計、整備に要する経費<br>※繰越明許、通次繰越含む | 3,207,322 | 3,013,226 | 194,096 | 主体工事(979,261)、機械設備工事(491,643)、電気設備工事(213,840)、情報防災設備工事(41,259)、工事監理(24,145)、麓山一丁目10号線道路改良工事(13,204)、麓山一丁目虎丸町線改良工事(46,893)、案内標識設置工事(2,648)、広場整備工事(88,187)、歴史資料館解体工事(36,571)、電波障害用アンテナ移設工事(2,948)、記念碑移設工事(990)、立体駐車場通路整備工事(3,410)、収蔵棚設置(214,500)、展示製作(808,318)、複製品製作(33,386)、City-WiFi構築委託(7,480)、ホームページ制作委託他(4,543) |
| 事務経費                        | 31,078    | 17,248    | 13,830  | 報償費(227)、旅費(1,566)、需用費(7,564)、役務費(54)、使用料及び賃借料(8)、備品購入費(7,829)、負担金補助及び交付金(0)                                                                                                                                                                                                                                       |
| 総 額                         | 3,238,400 | 3,030,474 | 207,926 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

※1 継続費 博物館の施工（R4年度 0千円、R5年度 1,310,970千円、1,176,592千円（通次繰越） R6年度 692,305千円）  
※2 債務負担行為 収蔵棚の設置（R5年度 33,948千円（繰越明許）、R6年度 180,552千円）、展示製作・システム構築（R5年度 404,159千円（繰越明許）、R6年度 404,163千円、R7年度以降 40,420千円）、複製品製作（R5年度 18,609千円、25,392千円（繰越明許） R6年度 44,000千円）

## 【位置図】

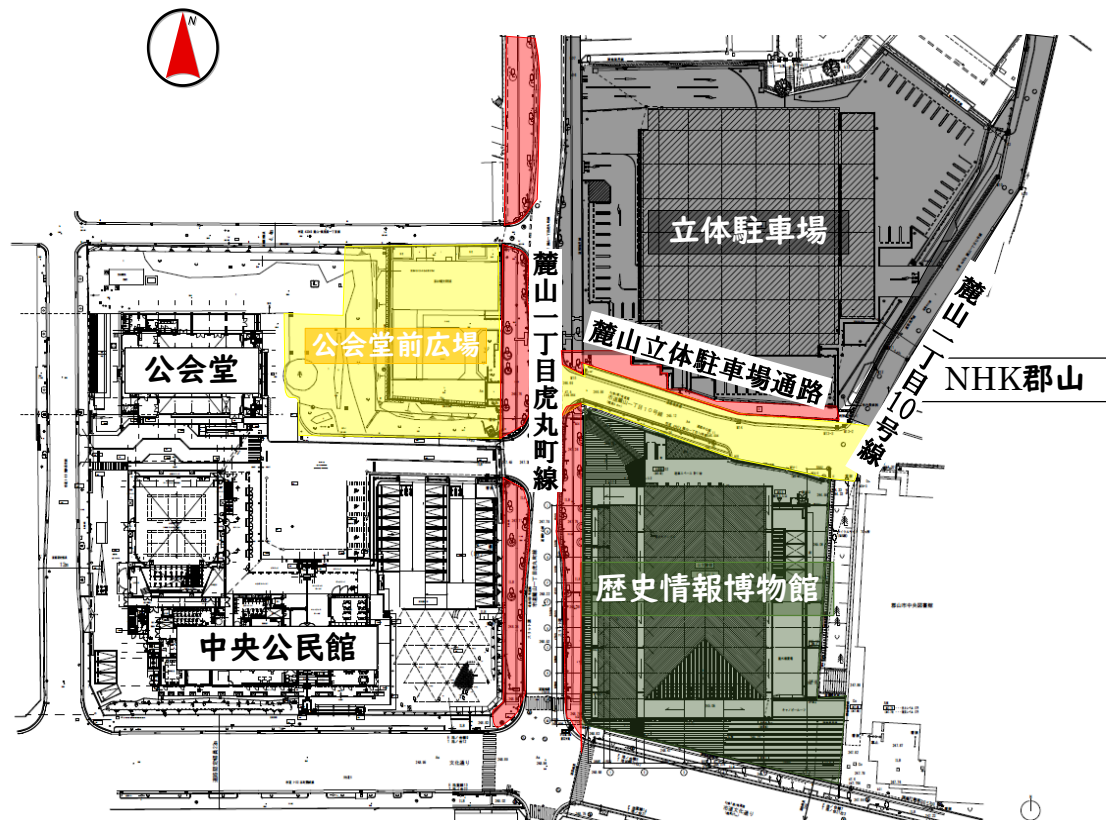

## 【歴史情報博物館】



(2024.11.25撮影)



＜アーカイブギャラリー＞



＜オープンスペース＞

(2024.11.11撮影)
