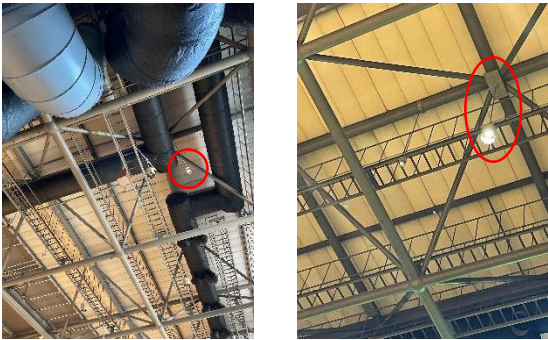
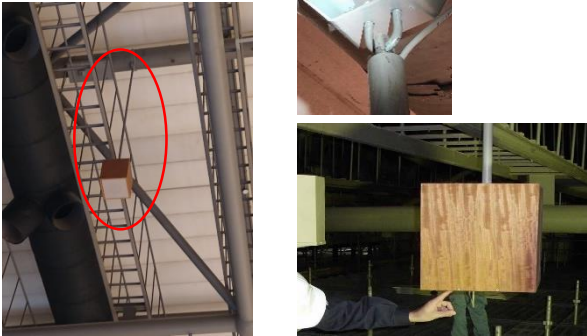


1 復旧修繕による対応

(1) 郡山総合体育館 ※令和4年4月29日 復旧修繕**工事中** [工期：4月29日から7月15日まで]

No.	被害状況写真		被害箇所		被害内容	修繕内容	要求水準書記載事項 (PFI事業)
1			大体育館	トラス部外壁 (南側中央部)	屋根トラス部分の外壁の 内外仕上材の破損・脱落	原形復旧	○ 要求水準書P18 施設改修に関する要求水準
2			大体育館	トラス部外壁 (東側)	屋根トラス部分の外壁の 内外仕上材の破損・脱落	原形復旧	(1) 地震による損傷個所の修繕・改修 (a) 屋根トラス部外壁の地震動による 変形・変異を考慮した形状・材質 への改良
			大体育館	排煙窓 (東側)	屋根トラス下(RC柱間) にあるアルミサッシおよ びガラスの破損・脱落	原形復旧	—
3			エントランスホール (1階)	側出入口上部 ガラス幕板	ガラス破損	原形にてガラスを 復旧	—

No.	被害状況写真	被害箇所		被害内容	修繕内容	要求水準書記載事項 (PFI事業)
4	休憩室 	休憩室 (2階)	東側出入口扉	両開き扉の常時利用側扉のガラス破損	原形にてガラスを復旧	—
			西側嵌め殺しガラス壁	間仕切り壁面のガラス破損	原型にてガラスを復旧	—
5		大体育館	天井吊り照明 (一般照明)	落下により破損(一基)	利用者の安全面を考慮して、一時的に全数撤去	—
			天井吊り照明 (一般照明) (放送スピーカー)	支持材脱落	一般照明については、利用者の安全面を考慮して、一時的に撤去。放送スピーカーは落下防止措置としてキャットウォークに固定し、落下防止ネットを取り付け	—

No.	被害状況写真	被害箇所		被害内容	修繕内容	要求水準書記載事項 (PFI事業)
6		大体育館	天井吊り照明 (非常用照明)	被害なし	利用者の安全面を考慮し、落下防止措置としてキャットウォークに固定し、落下防止ネットを取り付け	—
7		大体育館	天井吊り 放送スピーカー	被害なし	利用者の安全面を考慮し、落下防止措置としてキャットウォークに固定し、落下防止ネットを取り付け	—
8		大体育館	天井吊り外 (観客席上部)	支持材一部破断	キャットウォークから作業できる範囲で対応 (破損部撤去及び増し締め並びに補強)	—

1 復旧修繕による対応

(2) 開成山野球場 ※令和4年4月26日 復旧修繕完了済み

No.	被害状況写真	被害箇所		被害内容	修繕内容	要求水準書記載事項 (PFI事業)
1		屋外ブリッジ	接続部擁壁	ブリッジに 対面した擁壁の クリートの損傷	損傷部分の補修 済み	○ 要求水準書P26 施設改修に関する要求水準 (サ) 地震による損傷個所の修繕・改修 (a) 外野擁壁とブリッジのクリアランス拡幅 (擁壁上部の切削。ガバ取り換え)

2 開成山地区体育施設整備事業(PFI事業)での対応

※「1 復旧修繕による対応」の対象とせず、PFI事業で対応

(1) 郡山総合体育館

No.	被害状況写真	被害箇所		被害内容	要求水準書記載事項 (PFI事業)
1		大体育館	天井吊り钩外 (アリーナ上部)	支持材一部破断・曲がり	要求水準書P18 施設改修に関する要求水準 (J) 地震による損傷個所の修繕・改修 (b) 大体育館天井の吊り設備への振れ止め及び 落下防止措置
2		柔道場	北西側鉄扉	枠周りに充填した珪藻土の 破損・脱落	要求水準書P18 施設改修に関する要求水準 (J) 地震による損傷個所の修繕・改修 (d) 柔道場の鋼製扉(1箇所)枠周りに充填された 珪藻土をコーキングに変更
3		剣道場	屋根ALC板	ひび割れ・破損	要求水準書P18 施設改修に関する要求水準 (J) 地震による損傷個所の修繕・改修 (e) 剣道場の天井ALC版損傷部分（ひび割れ、 欠損）の補修
4		小体育館	北東側パラペット	パラペットと笠木の間に充 填した珪藻土の破損・欠落	要求水準書P18 施設改修に関する要求水準 (J) 地震による損傷個所の修繕・改修 (c) 小体育館(北東部)のパラペットと笠木の間に 充填された珪藻土をコーキングに変更
