119号雨水幹線築造工事第1工区　工事状況

令和元年9月末 進捗率 約68%

9月は、No.1～2までのﾋｭｰﾑ管設置に係る推進設備撤去及び立坑No.2の掘削及びｺﾝｸﾘｰﾄ打設を行いました。
10月は、No.2～3までのﾋｭｰﾑ管設置に係る推進設備(泥濃式)設置を行い、ﾋｭｰﾑ管布設に着手します。

掘削状況

掘削(支保工)状況

掘削残土積込状況

コンクリート打設状況

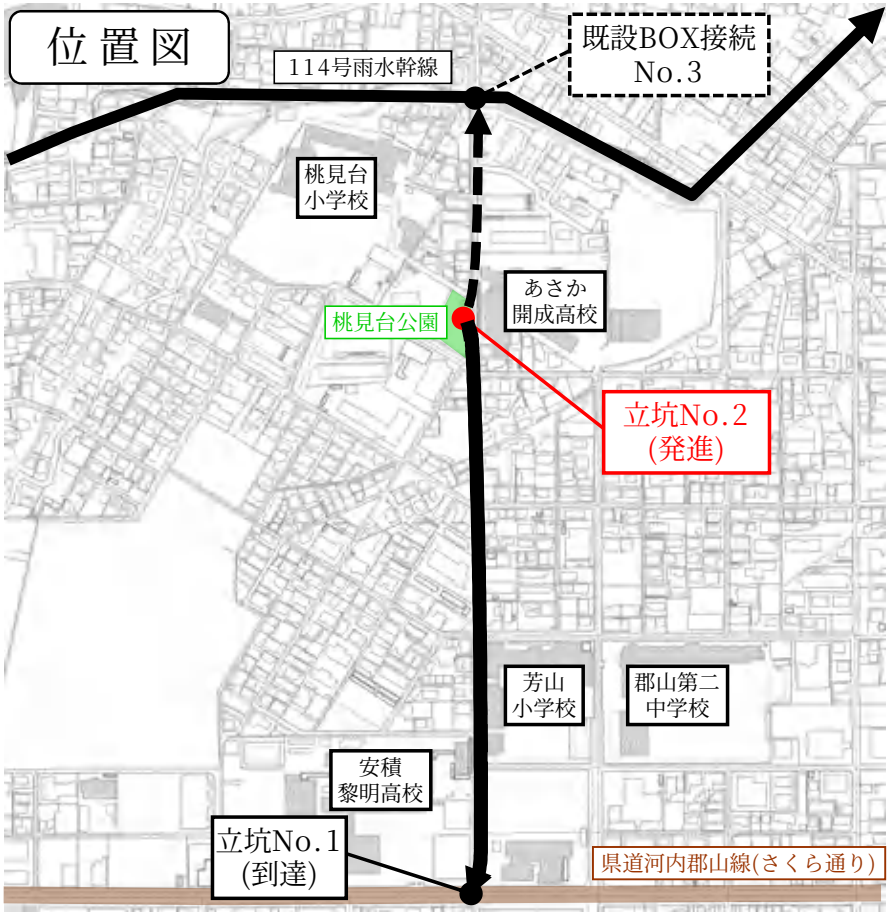

掘進機※…地中を掘り進むための機械。
