
公共下水道整備事業　富田東地区

4

進捗（10月末現在）


約67%（4706m　/　7070m）

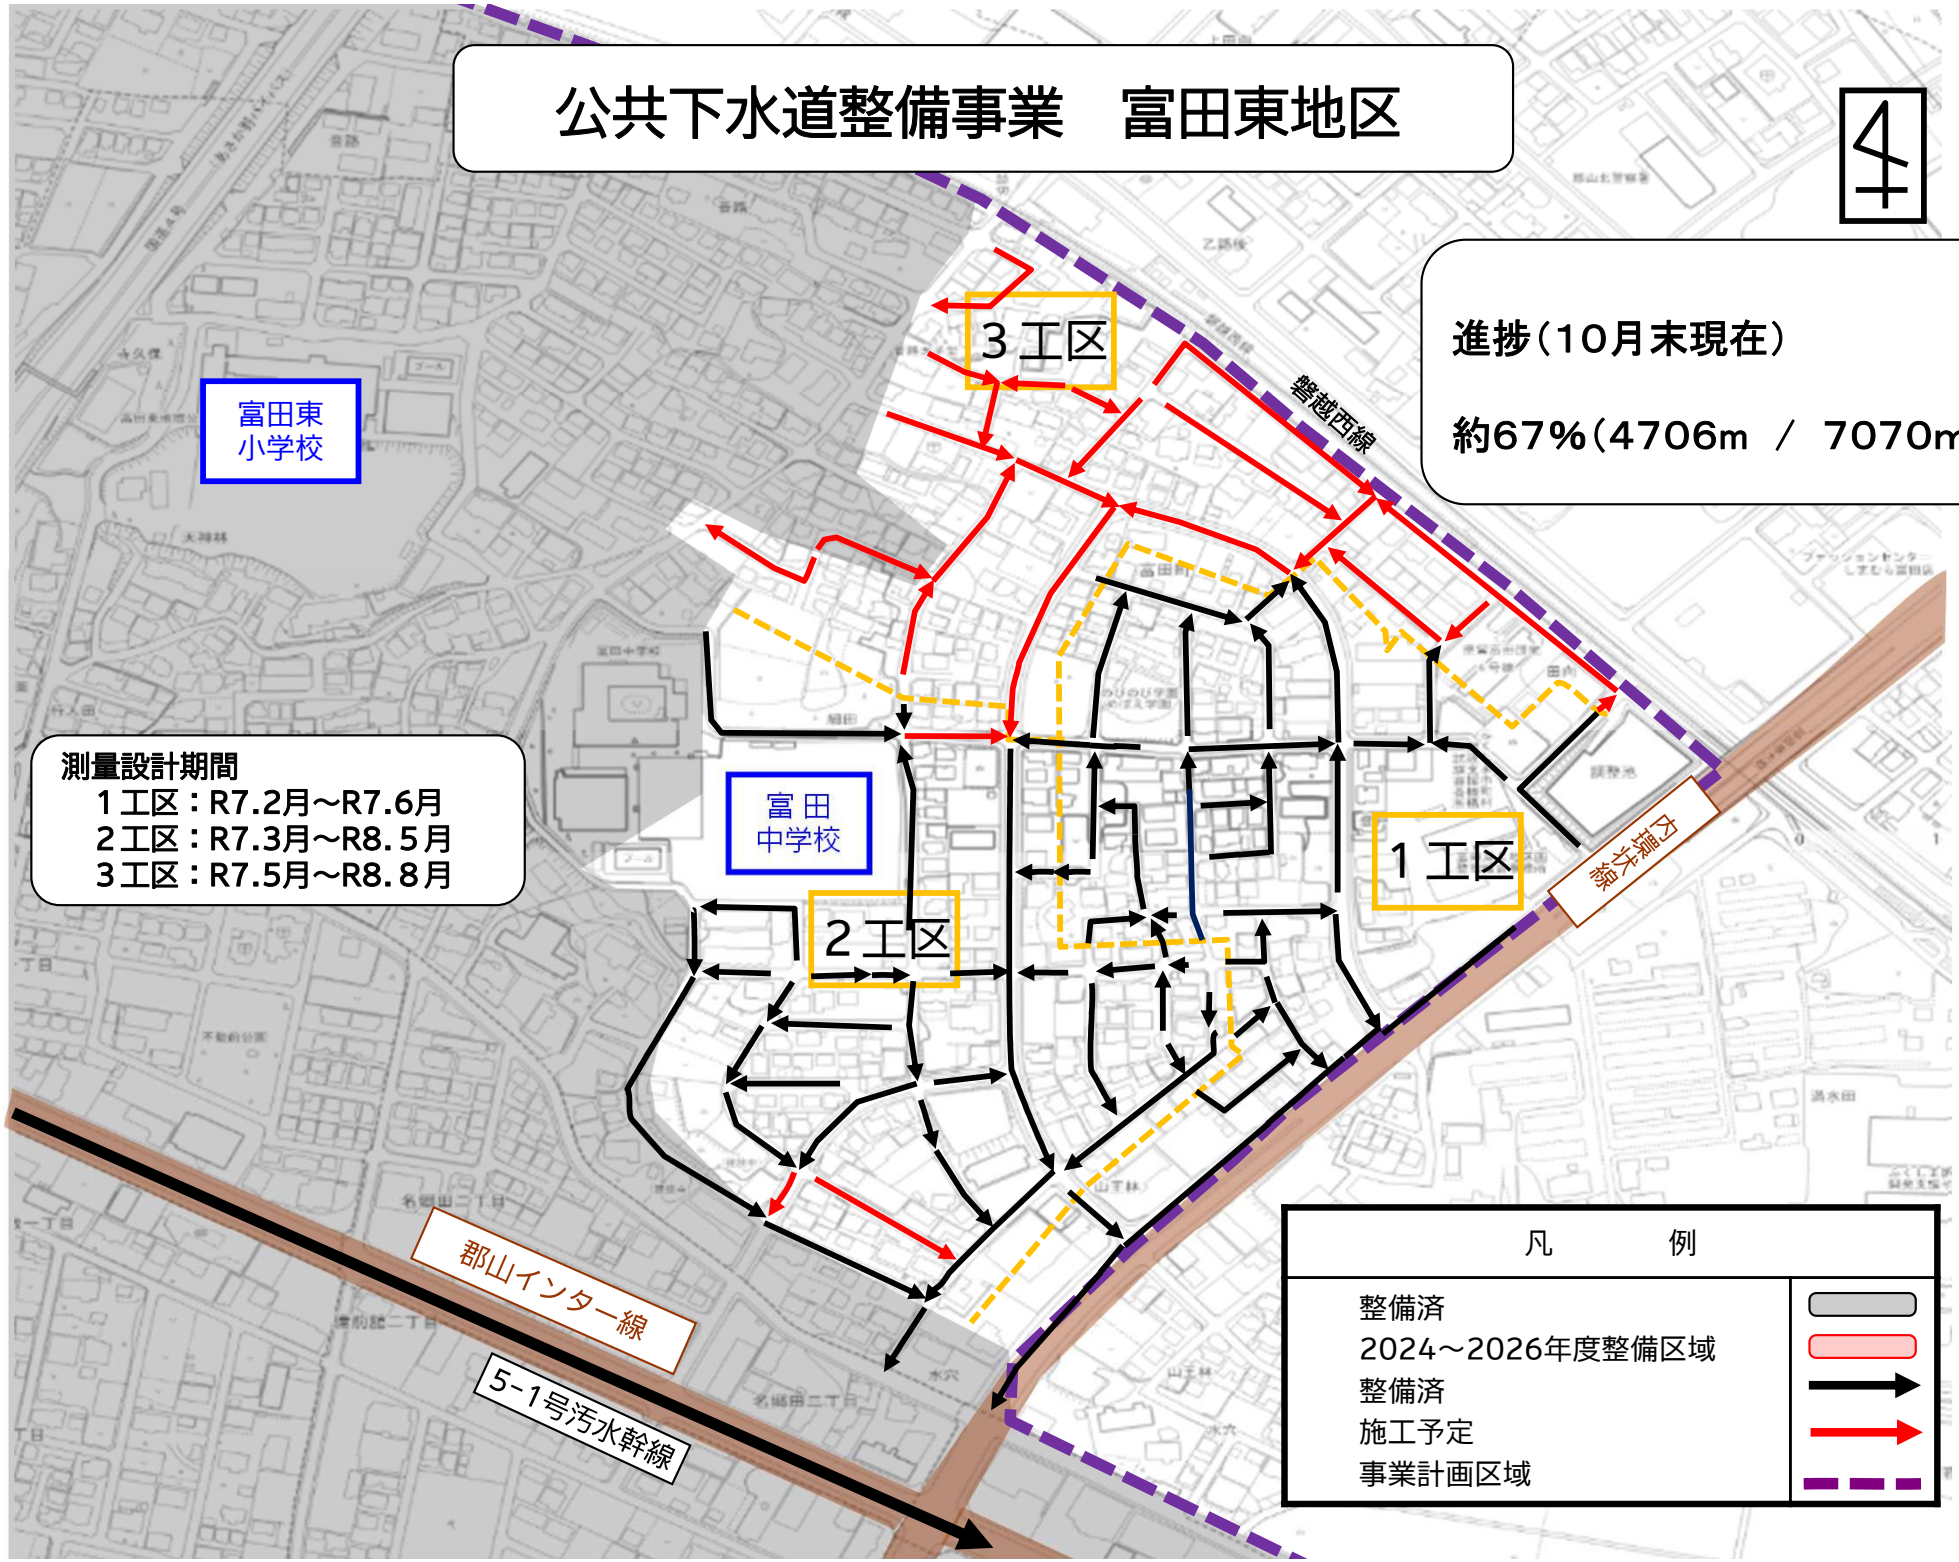

測量設計期間
- 1工区：R7.2月～R7.6月
- 2工区：R7.3月～R8.5月
- 3工区：R7.5月～R8.8月

凡　例

- 整備済
- 2024～2026年度整備区域
- 整備済
- 施工予定
- 事業計画区域

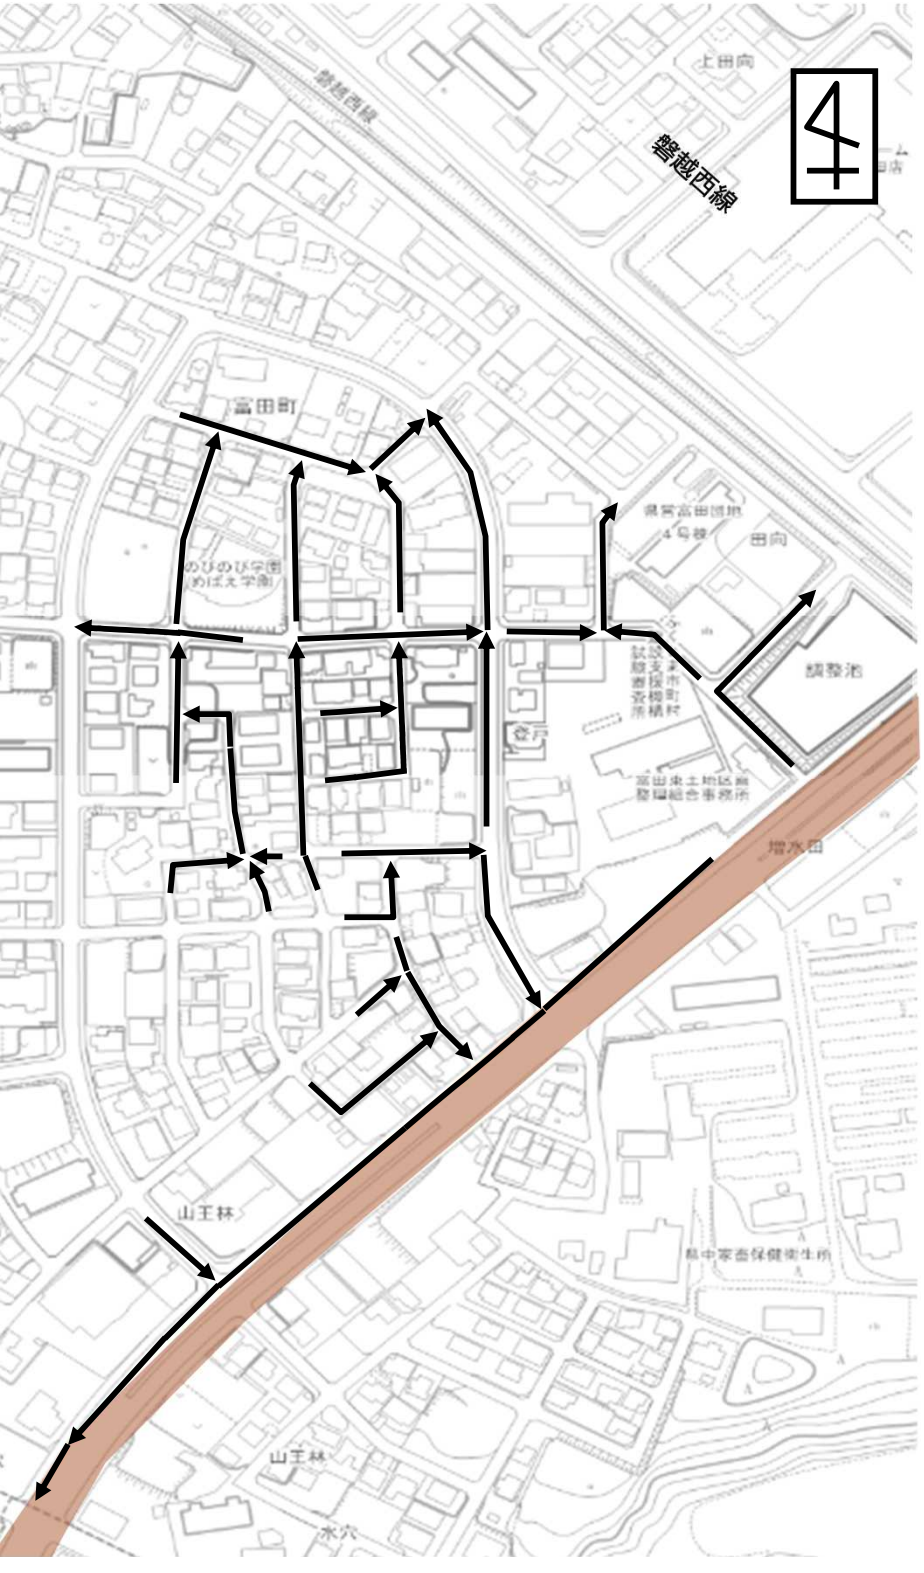

１工区進捗（工事完了）

施工済み下水道本管 ⟶

管路布設状況	2372m ／ 2372m
マンホール設置状況	80箇所 ／ 80箇所

舗装完了状況




舗装完了状況



着手から約１１ヶ月が過ぎ、皆様のご協力をいただき、工事は順調に進み、下水道本管の施工を終え、区画線工事を含め舗装工事も完了しました。

引き続き２工区での施工を行っておりますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。

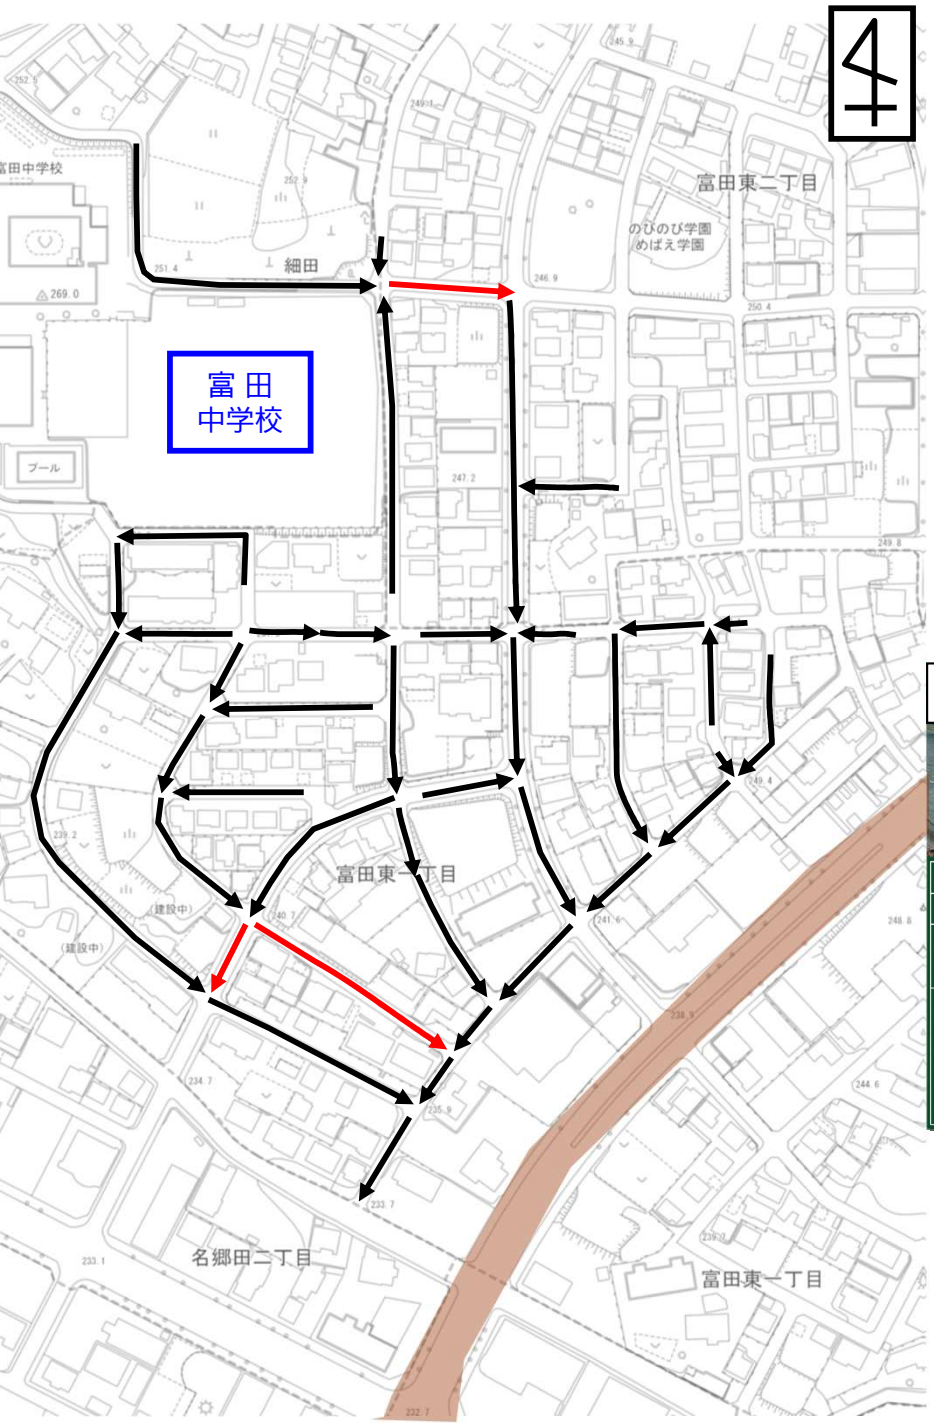


２工区進捗（10月末現在）

下水道本管

施工済み

管路布設状況	2334m ／ 2521m
マンホール設置状況	77箇所 ／ 82箇所

管布設状況

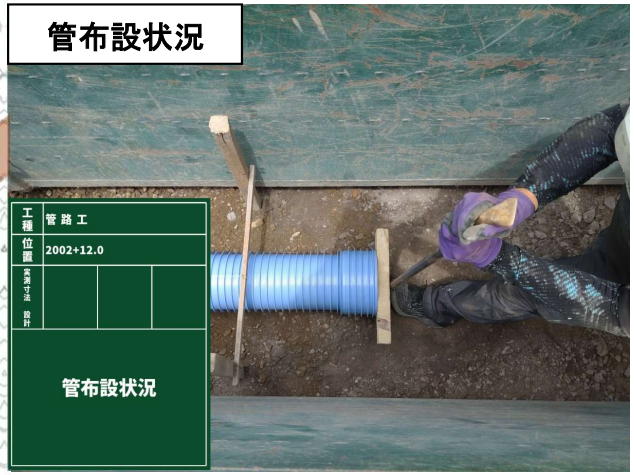

管布設状況



皆様のご協力もいただき、概ね下水道本管の施工を終え、１１月は下水道本管の施工が終了した区間から、舗装工事を予定しております。工事中は車の出入り等、皆様にご不便をおかけしますが、安全第一で進めてまいりますので、ご協力をお願いいたします。
