中央図書館　2021.2.13 福島県沖地震の復旧修繕と 2022.3.16 福島県沖地震被災の復旧について（案）

1　2021.2 地震の復旧修繕方針

- 改良復旧（原状復旧＋部分補強（安全性の向上））
  （長寿命化の視点をとり入れた改修）
- 施工方法の選択により、中央図書館における早期供用開始
- 代替サービスの提供による図書館機能の維持

2　2021.2 地震からの復旧修繕状況と経過

① 2021 年２月～４月　被災状況予備調査　**（３月５日～臨時窓口の設置）**

② 2021 年５月　復旧修繕に係る実施設計委託契約

（６月２日～12 月 26 日臨時図書館設置）

③ 2021 年 10 月　復旧修繕契約

④ 2021 年 10 月～2022 年３月 復旧修繕の実施

内部修繕	○各階　・壁面天井等補修・床壁下地仕上補修 ・トイレ壁改修 ○３階　・視聴覚ホール天井壁改修　　○２階　・書架改修
外部修繕	○外壁タイル改修 ○南側外壁一部撤去・アルミガラリ新設
部分補強	○１階こども図書館　・柱補強・梁補強・RC 壁補強 ○南側テラス　・制震ブレース設置

⑤ 2022 年１月～３月　１階北側の部分供用再開（2022 年１月 13 日～３月 13 日）

⑥ 2022 年３月～４月　全面再開館に向けた休館（2022 年４月８日　全面再開館予定）

⑦ 2022 年３月 16 日　福島県沖地震の発生

⑧ 2022 年３月 29 日　復旧修繕竣工予定日　→　工期の延長（事故繰越）

3　今後の復旧修繕等の進め方

- 原状復旧＋部分補強（安全性の向上）を進めた結果、比較的軽微な被害で済んだ。
- 軽微な被害ではあるが、修繕が必要であり、**復旧修繕の工期を延長し**修繕を実施する。
- 新たな被害箇所については追加発注を実施する。**（2022 年度　災害復旧費　補正予算）**
- **４月８日（金）から１階北側の利用可能なエリアで図書館サービスを再開する。**
- **４月 27 日（水）から２階部分の図書館サービスを再開する。**
- **全面再開館は、６月からを予定。（全面再開のための臨時休館は、５月下旬～）**

報告事項

2022.4.4　教育総務部中央図書館

4　被災状況図

中央図書館内図　１階

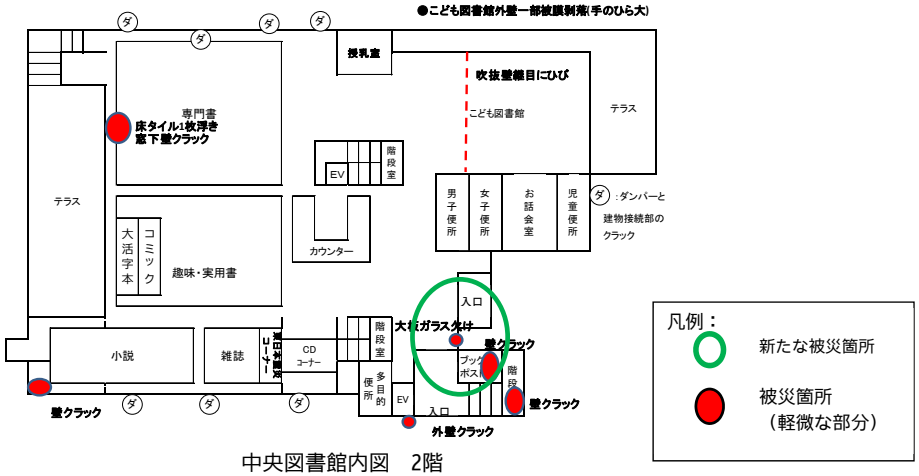

中央図書館内図　2階

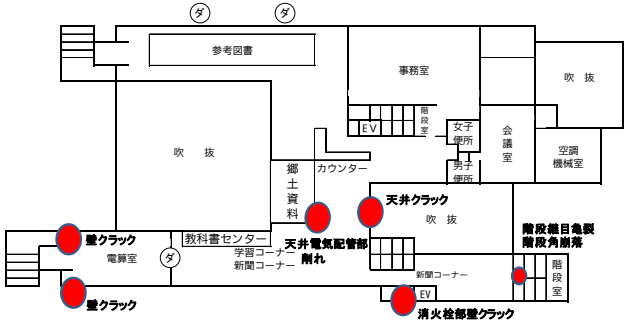
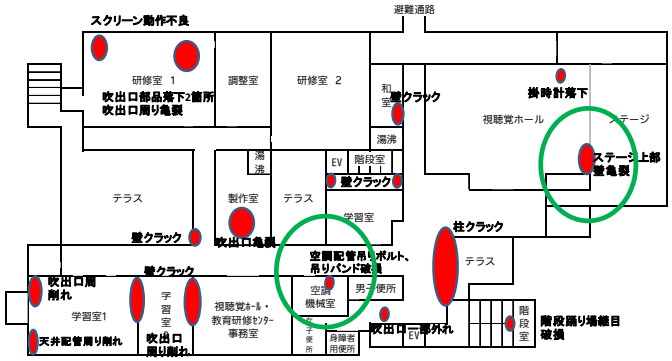
中央図書館内図　３階
