(令和4⇒5年度) 伊賀河原土地区画整理事業　道路改良工事(その4) 工事状況

施行場所：郡山市富久山町久保田 地内（都市計画道路 東部幹線）

令和5(2023)年7月末 進捗率 約68%

7月は、補強土壁工に係るコンクリート壁面材及びストリップ(鋼製材)設置を行いました。
8月は、引き続き、補強土壁工のコンクリート壁面材設置等を行います。

ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面材設置状況(全景)南側を望む

ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面材設置状況(全景)北側を望む

排水工(暗渠排水管及び砕石設置)施工状況
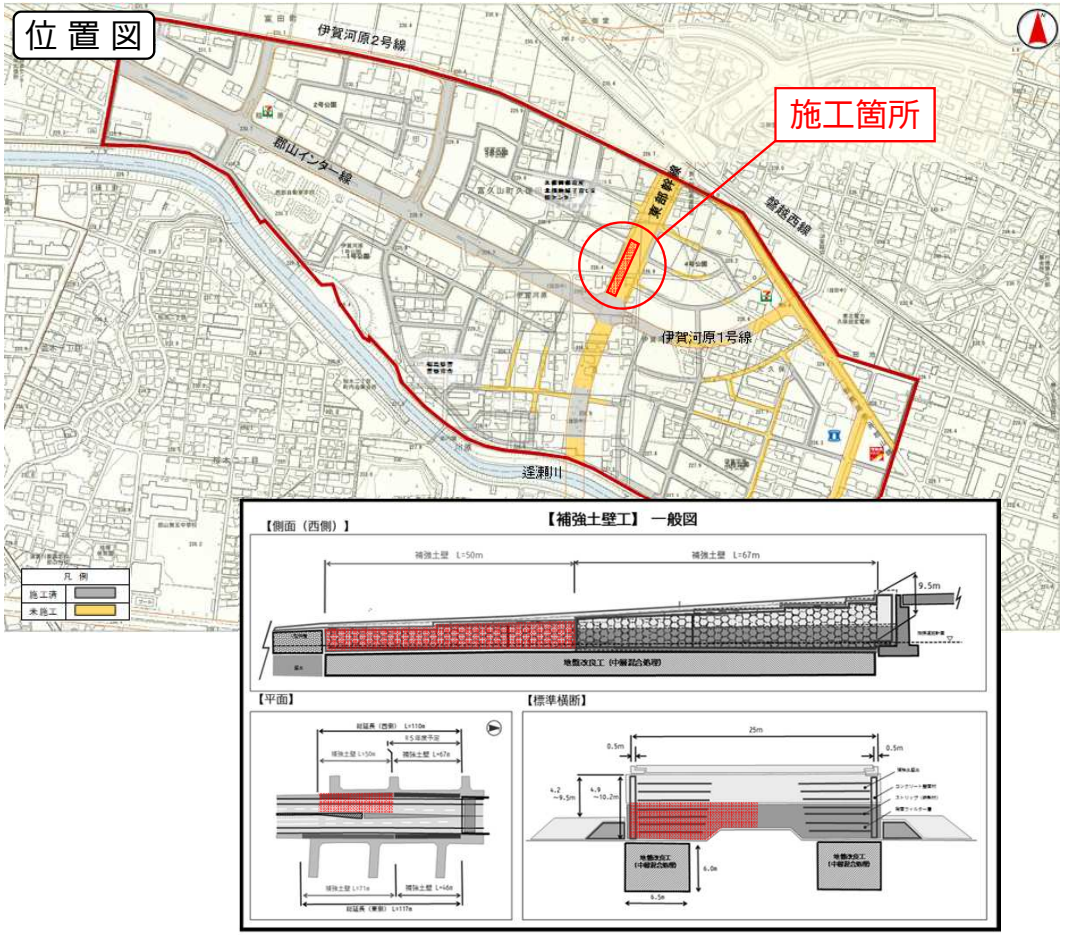
路体盛土転圧(9層目)状況
