（令和5年度）伊賀河原土地区画整理事業　道路改良工事　工事状況

施行場所：郡山市富久山町久保田 地内（都市計画道路 東部幹線）

令和5(2023)年12月末 進捗率 約37%

12月は、コンクリート壁面材の設置及び路体盛土に着手しました。
１月は、引き続き、補強土壁工のコンクリート壁面材設置を行います。

補強土壁工(ストリップ設置)状況

路体盛土状況

ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面材(3段目)設置状況(西側)
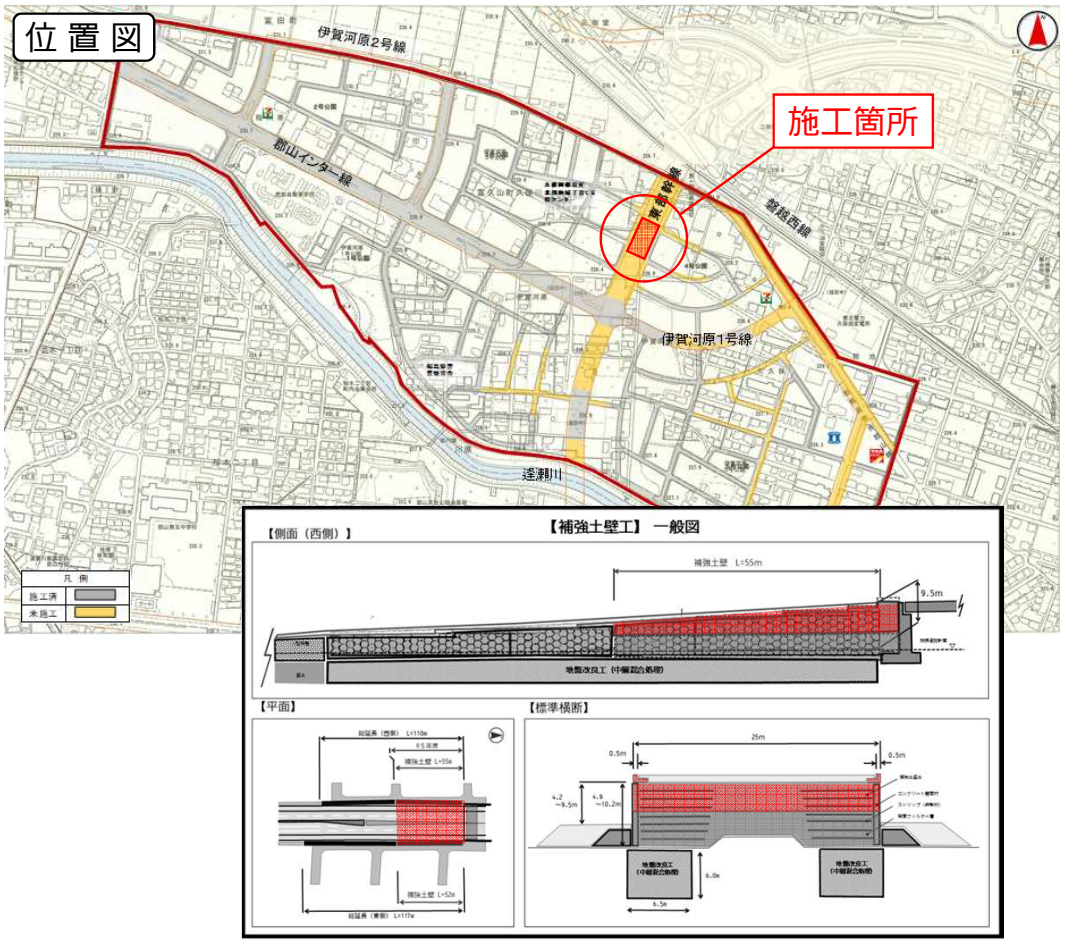
ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面材(3段目)設置状況(東側)
