

令和 7 年 9 月定例会
議案調査資料
(財務部)

工事請負契約議案説明資料


議案第 130 号 河川改修工事（準用河川愛宕川）
（工事請負契約の変更について）

P. 1～2

工事請負契約の変更について

- 1 工 事 名 河川改修工事（準用河川愛宕川）
- 2 工 事 場 所 郡山市富久山町久保田字我妻 地内
- 3 請 負 業 者 尚楠・人輝特定建設工事共同企業体
- 4 工 事 期 限 令和 7 年 12 月 12 日
- 5 工 事 概 要
 - （1）工事内容 河川改修工事
施工延長 103.9メートル
プレキャストボックスカルバート工 一式
現場打函渠工 一式
- 6 変 更 理 由 仮設鋼矢板の打込みにおいて、周辺家屋への振動対策の検討に時間を要したこと及び河川流量が多く水替工法を変更したことで、工期内完成が困難なことから、現場打函渠工の減工等により請負代金を変更するものである。

河川改修工事（準用河川愛宕川）

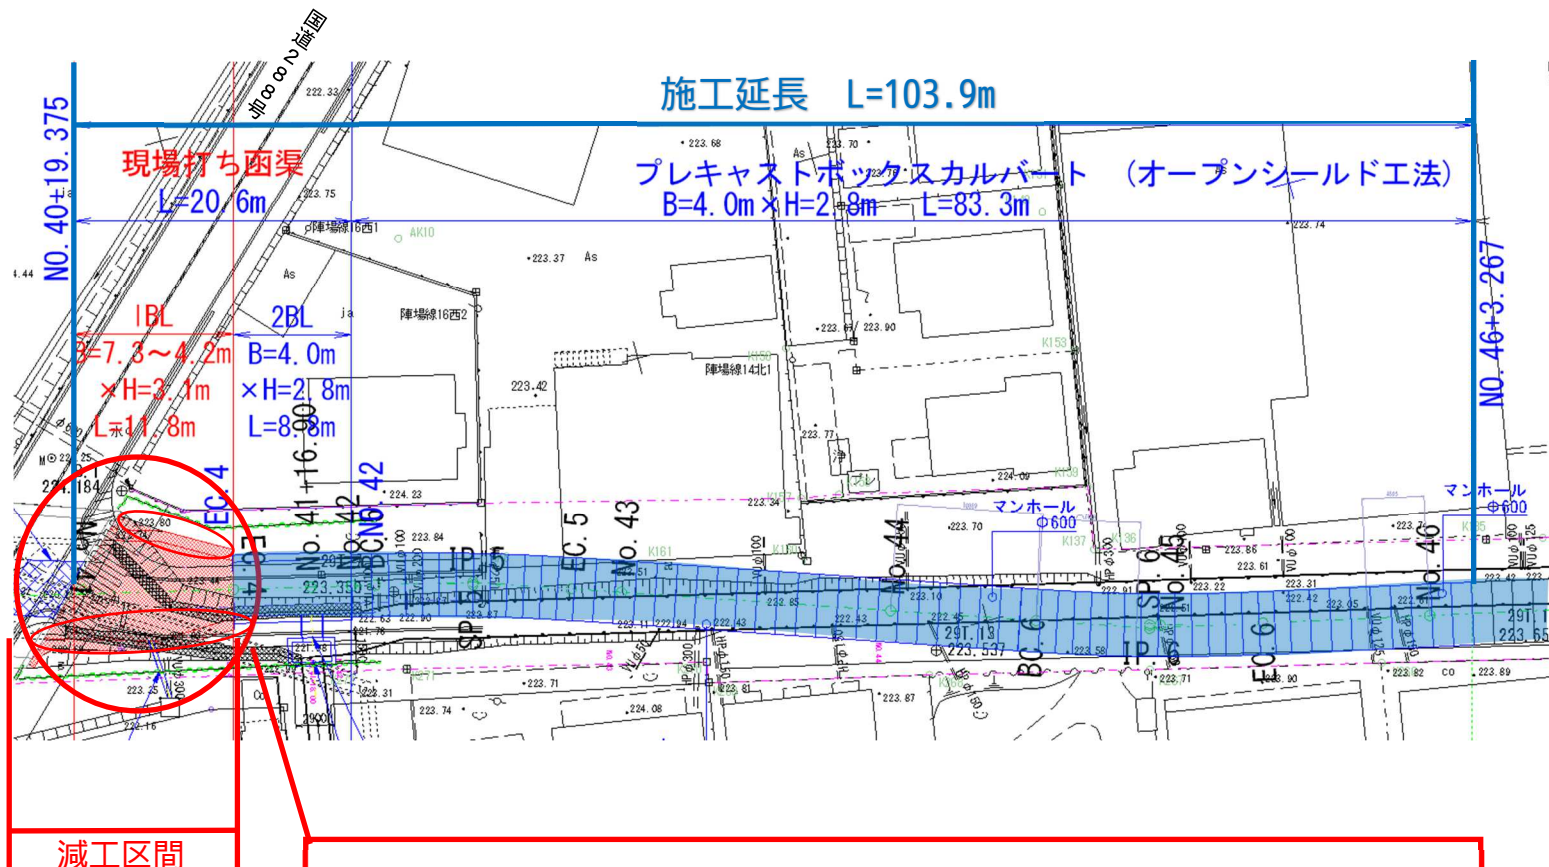

- ・隣接地権者から仮設鋼矢板の打込みについて、家屋への影響が懸念されるとの意見を受け振動対策の検討に時間を要した。
- ・河川流量が見込みより多く、水替工法を変更したことによる遅延
- ・このことから完成までの工期が確保できないため、工期内で完了できるよう現場打函渠工の施工延長の減工等をする。
