

令和 5 年 3 月定例会
議案調査資料
(財務部)

工事請負契約議案説明資料

議案第 22 号 県中都市計画事業伊賀河原土地地区画整理事業橋梁（上部工）整備工事
（工事請負契約の変更について）

P. 1～2

工事請負契約の変更について

- 1 工 事 名 県中都市計画事業伊賀河原土地区画整理事業橋梁（上部工）整備工事
- 2 工 事 場 所 郡山市富久山町 地内
- 3 請 負 業 者 トーピー建設工業株式会社・株式会社二嘉組特定建設工事共同企業体
- 4 工 事 期 限 令和5年3月17日
- 5 工 事 概 要
 - （1）工事内容 橋梁（上部工）整備工事
橋長 49.0メートル
幅員 25.0メートル
橋梁上部工（プレストレストコンクリートT桁橋） 一式
- 6 変 更 理 由 桁架設に使用するクレーンの位置について、現地周辺の地形地盤等の状況を踏まえ作業の安全性確保を図るため、配置を変更する必要があるが生じ、それに伴いクレーン規格や搬入路の仮設に係る費用、また、工事に要する資材価格等の高騰に伴い請負代金を変更するものである。



[桁架設概要図]

当初




平面

側面

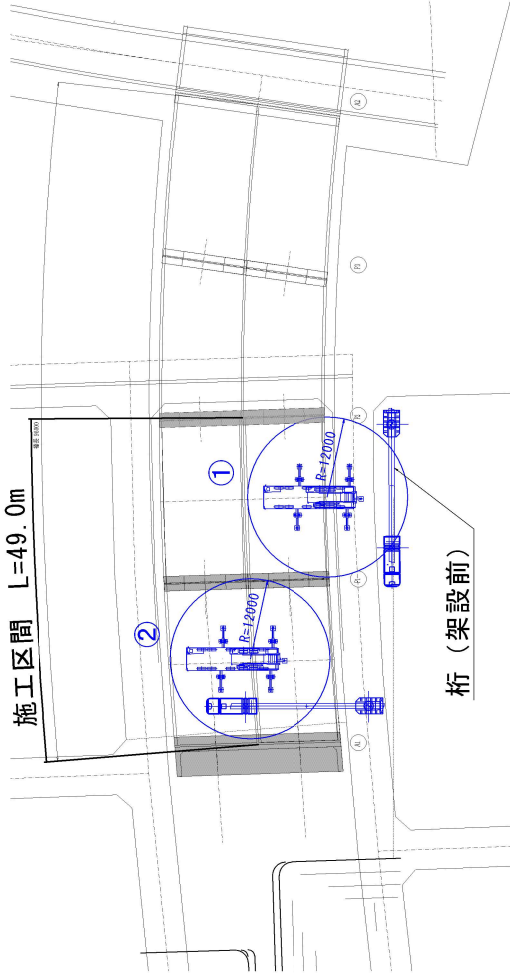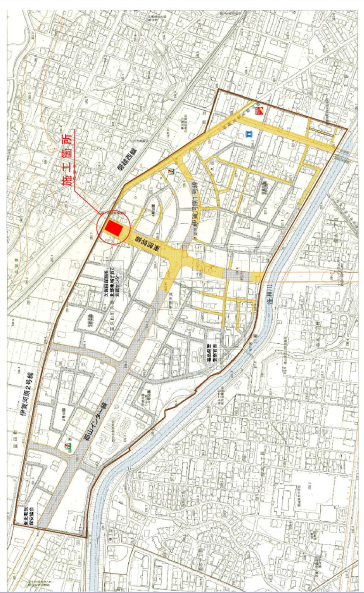

施工区間 L=49.0m

桁




変更



平面


側面

凡例	
—	当初
—	変更

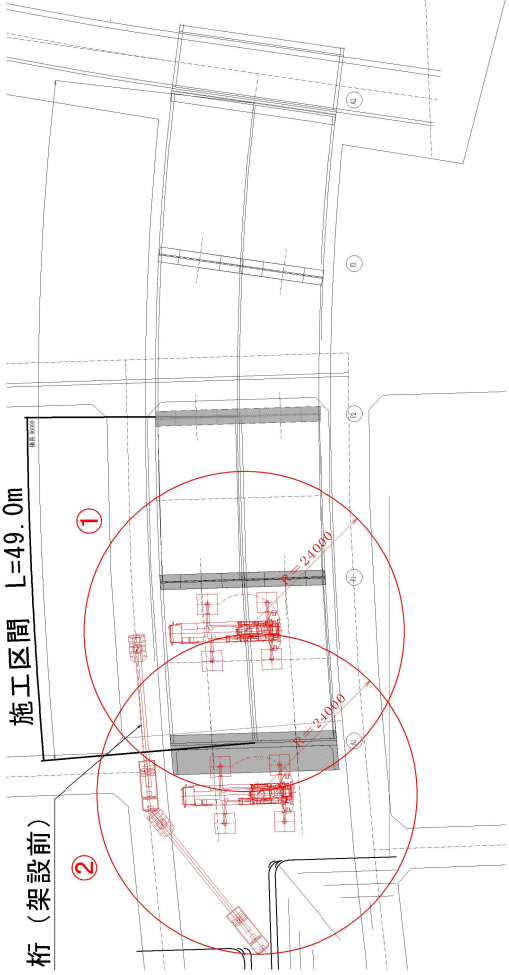

施工区間 L=49.0m

桁



※丸数字は架設順序を示します。
現場に搬入するクレーンは1台になります。
